

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ARUMANIS



Air Minum & Sanitasi Kabupaten Cianjur

Dokumen Panduan Operasional untuk Admin, Operator, dan Pengawas

Versi dokumen: 1.0 · Juni 2026

Alamat aplikasi: <https://arumanis.cianjur.space>

Halaman publikasi untuk video singkat tentang arumanis dan dokumen ini, bisa diakses di alamat:

<https://arumanis.cianjur.space/publikasi/arumanis-platform-untuk-monitoring-air-minum-sanitasi-H0cMH>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tentang Aplikasi

ARUMANIS (Air Minum & Sanitasi Cianjur) adalah aplikasi monitoring kegiatan-kegiatan Pekerjaan di bidang Air Minum dan Sanitasi. Aplikasi digunakan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kontrak, dokumentasi lapangan, pelaporan progress, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan pemantauan oleh pengawas.

Aplikasi terdiri dari dua bagian utama:

1. Arumanis Utama (/) — kantor pusat: master data, dashboard, kontrak, berkas, administrasi akses
2. Panel Pengawasan (/pengawasan/) — aplikasi lapangan untuk pengawas dan konsultan pengawas

1.2 Persyaratan Sistem

1. Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru
2. Koneksi internet stabil
3. Akun aktif (email dan password dari administrator)
4. Perangkat mobile/desktop dengan resolusi layar minimal 1280×720 (disarankan)

1.3 Cara Mengakses

1. Buka browser dan kunjungi <https://arumanis.cianjur.space>
2. Halaman Sign In (/sign-in) akan tampil jika belum login
3. Masukkan email dan password, lalu klik SIGN IN
4. Alternatif: tombol GOOGLE untuk login OAuth (jika diaktifkan admin)
5. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke Dashboard atau Panel Pengawasan sesuai role

BAB II NAVIGASI DAN ANTARMUKA

2.1 Tata Letak Halaman

Setelah login, tampilan Arumanis Utama terdiri dari Header (atas), Sidebar (kiri), dan Area Konten Utama. Header berisi logo, pemilih tahun anggaran (*Fiscal Year*), pencarian global (Ctrl+K), toggle tema terang/gelap, notifikasi, dan menu pengguna. Sidebar menampilkan modul sesuai hak akses role.

2.2 Menu Sidebar (Arumanis Utama)

Dashboard & Layanan

1. Dashboard (/dashboard) — ringkasan metrik dan grafik
2. Rekap Progress (/progress_rekap) — progress pekerjaan
3. Tiket & Laporan (/tiket) — pelaporan masalah
4. Pusat Notifikasi (/notifications)
5. Asisten AI (/chat) — Ami AI untuk penafsiran data

Master Data

1. Program Kegiatan (/kegiatan)
2. Kecamatan (/kecamatan) · Desa (/desa)
3. Pekerjaan (/pekerjaan) · Draft Pekerjaan (/draft-pekerjaan)
4. Aset & Capaian SPAM (/spam-unit) · SPM Sanitasi (/spm-sanitasi)
5. Penyedia (/penyedia) · Kontrak (/kontrak) · Addendum (/kontrak-addendums)
6. Output (/output) · Penerima (/penerima) · Pengawas (/pengawas)

Dokumentasi & Visualisasi

1. Foto (/foto) · Berkas (/berkas)
2. Peta Progress (/map) — peta sebaran pekerjaan
3. Simulasi Jaringan (/simulation)
4. Manajemen Publikasi (/manajemen-publikasi)

Akses & Pengaturan (Admin)

1. Users, Roles, Permissions, Route Permissions, Menu Permissions
2. Audit Trail, Settings, Assign Pekerjaan, Broadcast Notifikasi, WhatsApp

2.3 Komponen UI Dasar

Gunakan tombol primary untuk aksi utama (Simpan, Tambah), destructive untuk hapus, dan dialog konfirmasi sebelum aksi tidak dapat dibatalkan. Tabel mendukung sorting (klik header), pagination, dan filter. Form memakai validasi real-time; pesan error tampil di bawah field atau sebagai toast di pojok kanan atas.

BAB III MODUL UTAMA

3.1 Dashboard (/dashboard)

Dashboard menampilkan statistik kegiatan, pekerjaan, kontrak, output, penerima, dan indikator kualitas data. Pilih tahun anggaran di header untuk memfilter seluruh widget. Tab tersedia: Lounge, Overview, Analytics, Calendar, Reports.

1. KegiatanStats: total kegiatan, pagu, pekerjaan, kontrak, output, penerima
2. Grafik: kegiatan per tahun, sumber dana, pekerjaan per kecamatan/desa
3. Data Quality Stats: pekerjaan tanpa koordinat, foto, atau kontrak

3.2 Program Kegiatan (/kegiatan)

Kegiatan adalah program induk dengan pagu anggaran dan sumber dana (APBD, APBN, lainnya).

1. Klik Tambah Kegiatan → isi nama, kode (unik), sumber dana, pagu, tahun
2. Simpan → kegiatan dapat ditautkan ke pekerjaan
3. Edit/Hapus via ikon di baris tabel (hapus diblokir jika masih memiliki pekerjaan terkait)

3.3 Pekerjaan & Output

Pekerjaan (/pekerjaan) adalah proyek turunan kegiatan di tingkat kecamatan/desa.

1. Tambah Pekerjaan: pilih kegiatan, kecamatan, desa, isi kode unik, pagu, tahun
2. Output (/output): catat hasil fisik per pekerjaan (volume, satuan, realisasi)
3. Draft Pekerjaan: pekerjaan belum final → publikasikan menjadi aktif

3.4 Kontrak & Penyedia

Kontrak (/kontrak) menghubungkan pekerjaan dengan penyedia/vendor.

1. Pastikan pekerjaan dan penyedia sudah terdaftar
2. Tambah Kontrak: nomor unik, nilai, tanggal mulai/selesai, status
3. Addendum (/kontrak-addendums): perubahan nilai, waktu, atau ruang lingkup

3.5 Penerima Manfaat (/penerima)

Kelola data penerima individu atau komunal. Filter berdasarkan kecamatan/desa atau cari via NIK/nama. Klik baris untuk melihat detail lengkap.

3.6 SPAM Unit (/spam-unit)

Modul unit Sarana Penyediaan Air Minum perdesaan. Mencatat kapasitas, pengelola (POKMAS), capaian SR/KK/jiwa, integrasi SIMSPAM, dan rencana anggaran. Mendukung impor data massal CSV/Excel.

3.7 SPM Sanitasi (/spm-sanitasi)

Pemantauan infrastruktur sanitasi (SPALD-T, SPALD-S, IPLT) dan capaian pemanfaat per desa. Gunakan filter kecamatan, desa, dan tahun untuk evaluasi program air limbah.

3.8 Berkas & Foto

Berkas (/berkas): unggah dokumen PDF, DOC, XLS terkait pekerjaan (kontrak, laporan, RAB).

Foto (/foto): galeri dokumentasi umum per pekerjaan (JPG, PNG, WebP).

Catatan: pengawas lapangan mengunggah foto progress ber-slot (0%–100%) dan ber-GPS melalui Panel Pengawasan, bukan modul /foto utama.

3.9 Peta Progress (/map)

Visualisasi geografis sebaran pekerjaan dan progress di peta digital. Gunakan untuk review spasial lintas 33 kecamatan dan 365 desa/kelurahan.

3.10 Halaman Publik

Landing page (/) menampilkan capaian SPM air minum dan sanitasi per desa tanpa login — peta choropleth interaktif di bagian #capaian-spm. Publikasi tersedia di /publikasi.

BAB IV PANEL PENGAWASAN

4.1 Akses dan SSO

Panel Pengawasan tidak memiliki form login terpisah. Pengguna dengan role pengawas atau konsultan_pengawas login di /sign-in Arumanis, lalu diarahkan otomatis ke /pengawasan/ via SSO (token handoff → cookie pengawas_session).

Admin dan manager tetap di Arumanis utama. Admin dapat impersonate pengawas dari halaman Users (tombol Impersonate pada baris user) untuk meninjau tampilan lapangan —

browser diarahkan ke /pengawasan/login?code=... lalu masuk dashboard panel atas nama pengawas tersebut.

Cuplikan layar Panel Pengawasan dalam Lampiran A diambil dengan impersonate akun FITRI ANITA (beatrix3181@gmail.com, role user pengawas) dari akun admin.

4.2 Menu Panel Pengawasan

1. Dashboard — ringkasan dan paket perlu perhatian
2. Pekerjaan — daftar paket yang ditugaskan
3. Buat Laporan — input rencana dan realisasi mingguan (RAB)
4. Tiket — laporan kendala lapangan
5. Notifikasi · Panduan · Profil

4.3 Detail Pekerjaan (6 Tab)

1. Ringkasan — kegiatan, lokasi, pagu, status foto
2. Output — komponen pekerjaan
3. Penerima — data individu/komunal, NIK, jumlah jiwa
4. Foto — matriks output × slot 0%, 25%, 50%, 75%, 100% (GPS wajib)
5. Progress — estimasi fisik dan keuangan mingguan
6. Tiket — kendala terkait paket

4.4 Alur Kerja Pengawas Mingguan

1. Login → masuk Panel Pengawasan
2. Buka pekerjaan → tab Foto → unggah slot progress yang kosong
3. Tab Progress / Buat Laporan → isi rencana dan realisasi minggu ini
4. Jika ada kendala → buat Tiket
5. Verifikasi status paket: Belum ada foto / Belum Selesai / Selesai

BAB V MANAJEMEN AKSES

5.1 Peran Pengguna

1. Admin — akses penuh, kelola user/role, impersonasi, bypass route permission
2. Operator — tambah/edit data di wilayah tugas, upload berkas/foto
3. Viewer — hanya melihat data
4. Pengawas / Konsultan Pengawas — Panel Pengawasan via SSO

5.2 Route Permission

Admin dapat membatasi akses route per role di menu Route Permissions. Admin selalu bypass. Jika menu tidak muncul di sidebar, kemungkinan route permission atau menu permission membatasi role Anda — hubungi administrator.

5.3 Logout

1. Klik avatar/nama di header → Logout
2. Session berakhir → otomatis kembali ke /sign-in
3. Panel Pengawasan: logout sidebar → kembali ke /sign-in Arumanis

BAB VI SKENARIO PENGGUNAAN

6.1 Input Kegiatan Baru + Pekerjaan + Dokumentasi

1. Login → Dashboard
2. Kegiatan → Tambah (nama, kode, sumber dana, pagu)
3. Pekerjaan → Tambah (kegiatan, kecamatan, desa)
4. Output → Tambah hasil fisik
5. Berkas/Foto → unggah dokumentasi
6. Dashboard → verifikasi metrik terupdate

6.2 Kontrak Baru

1. Pastikan pekerjaan dan penyedia terdaftar
2. Kontrak → Tambah → isi nomor, nilai, tanggal
3. Addendum bila ada perubahan kontrak

6.3 Review Progress

1. Dashboard → pilih tahun anggaran
2. Rekap Progress / Peta Progress / modul Foto
3. Perbaiki gap dari Data Quality Stats

6.4 Manajemen User (Admin)

1. Roles → pastikan role tersedia
2. Route Permissions → atur akses
3. Users → Tambah akun (nama, email, password, role)
4. Assign Pekerjaan (opsional)

BAB VII PEMECAHAN MASALAH

7.1 Masalah Login

1. Invalid email or password — periksa kredensial
2. Session expired / 401 — login ulang
3. Account inactive — hubungi admin

7.2 Error Akses

1. 403 Forbidden — role tidak memiliki izin; hubungi admin
2. 404 Not Found — periksa URL atau data sudah dihapus

7.3 Upload Gagal

1. File terlalu besar — kompres (batas umum 5–10 MB)
2. Tipe tidak didukung — gunakan JPG/PNG/PDF/DOC/XLS
3. Gagal upload — cek koneksi, coba refresh

7.4 Panel Pengawasan


1. Loop redirect token — pastikan build terbaru; masuk lewat /sign-in Arumanis
2. 401 di panel — klik Masuk ulang
3. GPS gagal — izinkan lokasi browser atau isi koordinat manual
4. Progress tidak tersimpan — pastikan ada perubahan Rencana/Realisasi

7.5 Langkah Umum

1. Refresh halaman (F5)
2. Logout → login ulang
3. Coba browser lain atau clear cache atau mode incognito
4. Hubungi administrator

LAMPIRAN A CUPLIKAN LAYAR

Gambar berikut diambil dari lingkungan produksi <https://arumanis.cianjur.space> per Juni 2026. Modul Arumanis Utama diambil dengan akun admin; Panel Pengawasan (Gambar 11–16) diambil setelah admin melakukan Impersonate pada user FITRI ANITA (role pengawas).

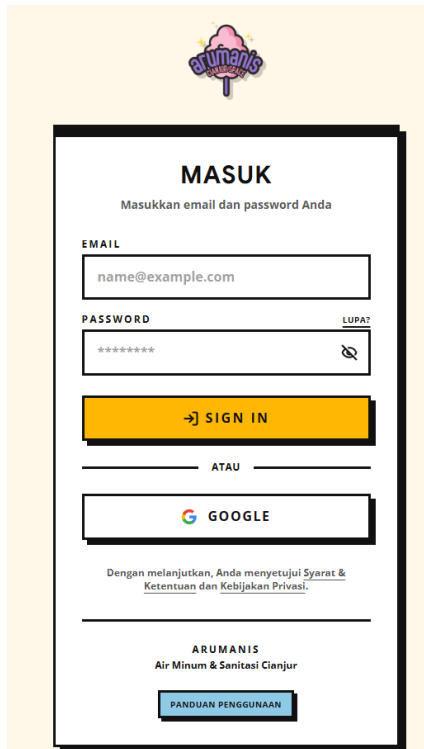

The screenshot shows the login interface for Arumanis. At the top is the Arumanis logo. Below it is a white box with a black border containing the login form. The form has a title 'MASUK' and a subtitle 'Masukkan email dan password Anda'. It includes an 'EMAIL' field with the placeholder 'name@example.com', a 'PASSWORD' field with masked characters and a 'LUPA?' link, and a yellow 'SIGN IN' button. Below the button is an 'ATAU' separator and a 'GOOGLE' login button. At the bottom, there is a link to the terms and conditions and a 'PANDUAN PENGGUNAAN' button.

Gambar 1. Halaman masuk (Sign In) — /sign-in



Gambar 2. Dashboard — ringkasan metrik program

Home

Program Kegiatan

TA 2026

Search

Daftar Kegiatan

Kelola data kegiatan dan anggaran

Tambah Kegiatan

Data Kegiatan

Program	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aksi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Peng	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Stratu	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sanitasi	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sanitasi	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Unit pengolahan setempat	

Gambar 3. Program Kegiatan — /kegiatan

Daftar Pekerjaan

Kelola data pekerjaan dan paket

Ekspor PDF

Ekspor Excel

Tambah

Data Pekerjaan

Cari pekerjaan...

Filter Kecamatan: Semua Kecamatan

Filter Sub Kegiatan: Semua Sub Kegiatan

Filter Tag: Semua Tag

Filter Pengawas: Semua Pengawas

Urutkan: Terbaru

Turun

Nama Paket	Sub Kegiatan	Kecamatan	Desa	Pengawas	Pendamping	Aksi
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 3 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Ilham	Belum Ada	
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 1 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 2 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultansi Pekerjaan Kebijakan dan Strategi Daerah (jakStada) Penyedia Air Minum 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.008.00008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
DED Pembangunan IPLT 1.03.05.2.01.0044.5.1.02.02.008.00008	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Konsultan Kegiatan Study EHRA 1.03.05.2.01.0044.5.1.02.01.001.00039	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Sukamulya Kecamatan Cikadu 1.03.03.2.01.0029.5.1.02.01.001.00039	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Cikadu	Sukamulya	Konsultan Paket 3	Uwet	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 4 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 3 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 2 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 1 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	

Gambar 4. Daftar Pekerjaan — /pekerjaan

Kontrak

Kelola data kontrak pekerjaan

Template

Impor XLSX

Tambah Kontrak

Daftar Kontrak (96)

Ekspor Excel

Cari kontrak...

Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak	No/Tgl SPK	Aksi
Kp.Pataruman Rt.01.02.03 Rw.10 dan Rt.03 Rw.08 Desa Kawung Luwuk Kec. Sukaresmi	Rp 100.000.000	DAU	CV. PUTRA SILIWANGI PADJAJARAN	Rp 99.544.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.096.382/2026 25 Jun 2026	...
Pembangunan MCK Individu - Paket 37 Desa Susukan Kec. Campaka	Rp 25.000.000	DAU	CV. MANDALA PUTRA SALUYU	Rp 24.774.100	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.094.374/2026 24 Jun 2026	...
Pembangunan MCK Individu - Paket 13 Desa Kawungluwuk Kec. Sukaresmi	Rp 125.000.000	DAU	CV. MANDALA PUTRA SALUYU	Rp 99.458.600	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.095.378/2026 24 Jun 2026	...
Kp. Pasir Nangka Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.615.200	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.092.366/2026 18 Jun 2026	...
Kp. Cipetir Desa Sukatani Kec. Haurwangi	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.534.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.091.362/2026 18 Jun 2026	...
Kp. Cibiuk RT Emam Desa Cibiuk Kec. Ciranjang	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.060.500	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.093.370/2026 18 Jun 2026	...
Komitmen 12 Paket • Pembangunan MCK Individu - Paket 21 Desa Sirnagalih Kec. Sindangbarang • Pembangunan MCK Individu - Paket 9 Desa Cinerang Kec. Naringgul	Rp 300.000.000	DAU	CV. Yusuf Rahmat Hidayat	Rp 299.343.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.083.330/2026 3 Jun 2026	...
	Rp 75.000.000	DAU	CV. RAYYAN RAIHAN	Rp 49.652.800	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.084.334/2026 5 Jun 2026	...
	Rp 300.000.000	DAU	CV. ARKHAN BANGUN MANDIRI	Rp 298.699.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.087.346/2026 5 Jun 2026	...
Komitmen 13 Paket • Pembangunan MCK di Kp. Simasari Rt.006/002 Desa Sukajaya kec. Leles • Pembangunan MCK Kp. Cikalapa Rt. 09/04 Desa Cinerang Kec. Naringgul • Pembangunan MCK Kp. Cisarap Rt. 016/04 Desa Sukajaya Kec. Leles	Rp 300.000.000	DAU	CV. ARKHAN BANGUN MANDIRI	Rp 298.699.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.087.346/2026 5 Jun 2026	...

Gambar 5. Pengelolaan Kontrak — /kontrak

Aset SPAM & Capaian SPM

Pantau capaian SPM, integrasi pekerjaan air minum per desa, dan kelola master unit SPAM.

Capaian SPM

Integrasi Wilayah

Master Unit SPAM

Filter Capaian SPM

Data capaian unit SPAM, target desa, BJP, dan anggaran — terpisah dari integrasi pekerjaan.

Semua KecamatanSemua DesaSemua Tahun

Periode capaian: uld tahun 2025

Acuan master uld 2025

Integrasi 2026+ terpisah

Target KK Desa

534.952

SR Tercatat

53.205

KK / jiwa

53.206 KK

266.020 jiwa

Anggaran Tercatat

Rp 91.474.124.404

Capaian SPM

13.24%

Unit SPAM

364

33 UnitSPAM - 331 standar

Komposisi Capaian

Acuan master tidak diampa. Capaian integrasi hanya tahun 2026 ke atas.


Indikator	Acuan s/d 2025	Integrasi 2026+	Total Tercatat
Sumbangan Rumah (SR)	53.131	74	53.205
Kepala Keluarga (KK)	53.131	75	53.206
Jiwa Terlayani	265.657	363	266.020
Nilai Kontrak / Anggaran	Rp 90.479.525.404	Rp 994.599.000	Rp 91.474.124.404

Perhitungan Cakupan SPM


(JP * Total BJP) / Target KK desa * 100%

Jumlah Penduduk (JP) — KK tercatat	53.131 KK
BJP Master (desa)	17.521 KK
BJP Unit SPAM	160 KK
Total BJP	17.681 KK
BJP jiwa (estimasi x5)	88.405 jiwa
Cakupan SPM	13.24%


Gambar 6. Aset & Capaian SPAM — /spam-unit

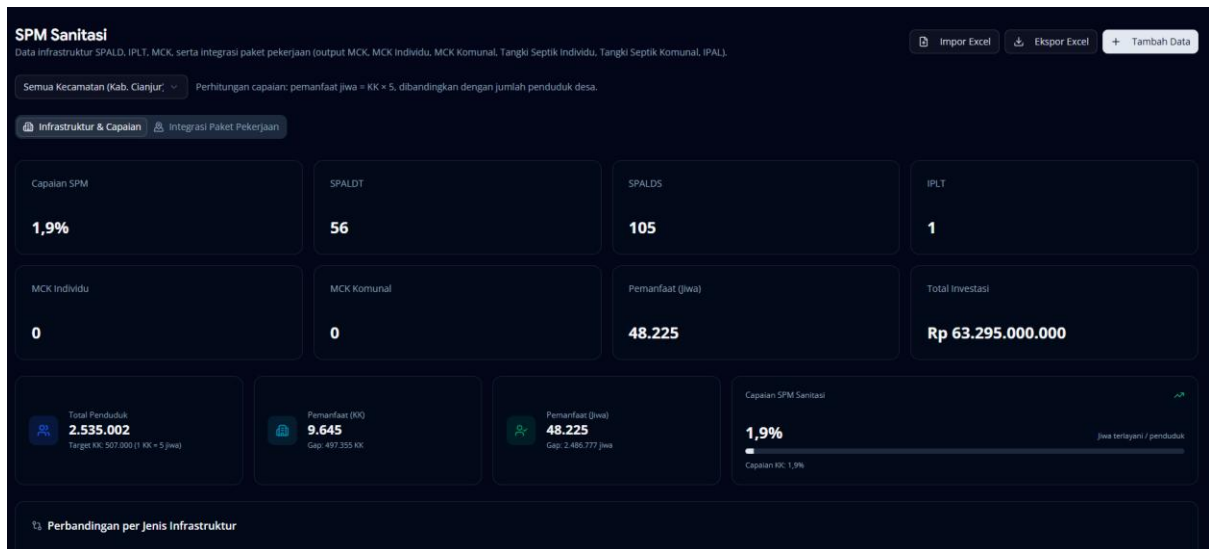


Gambar 7. SPM Sanitasi — /spm-sanitasi

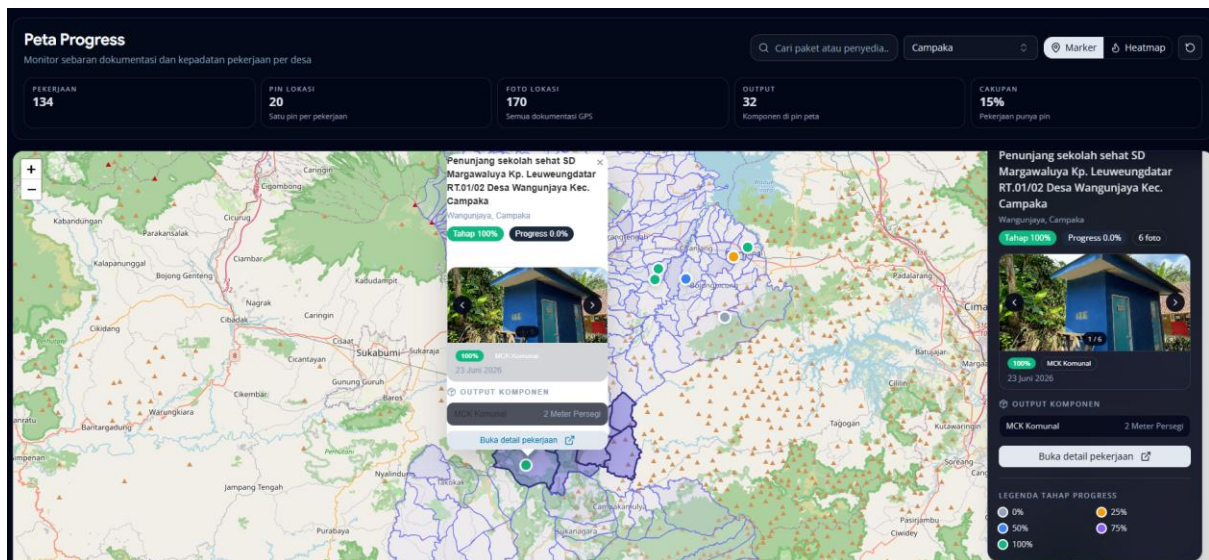


Gambar 8. Peta Progress — /map

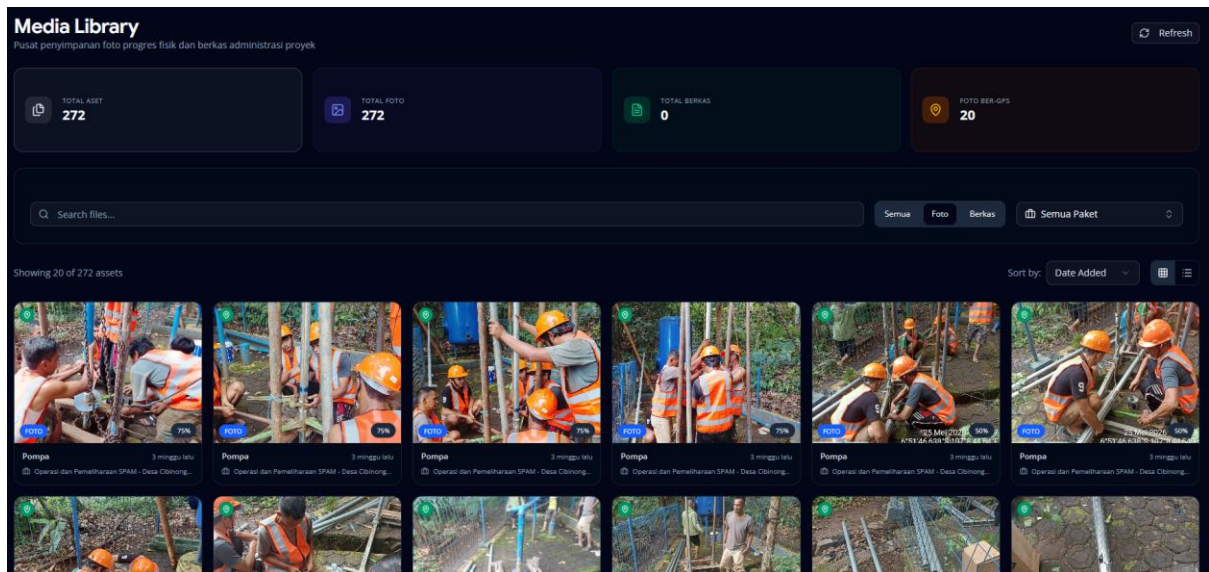


Gambar 9. Galeri Foto — /foto

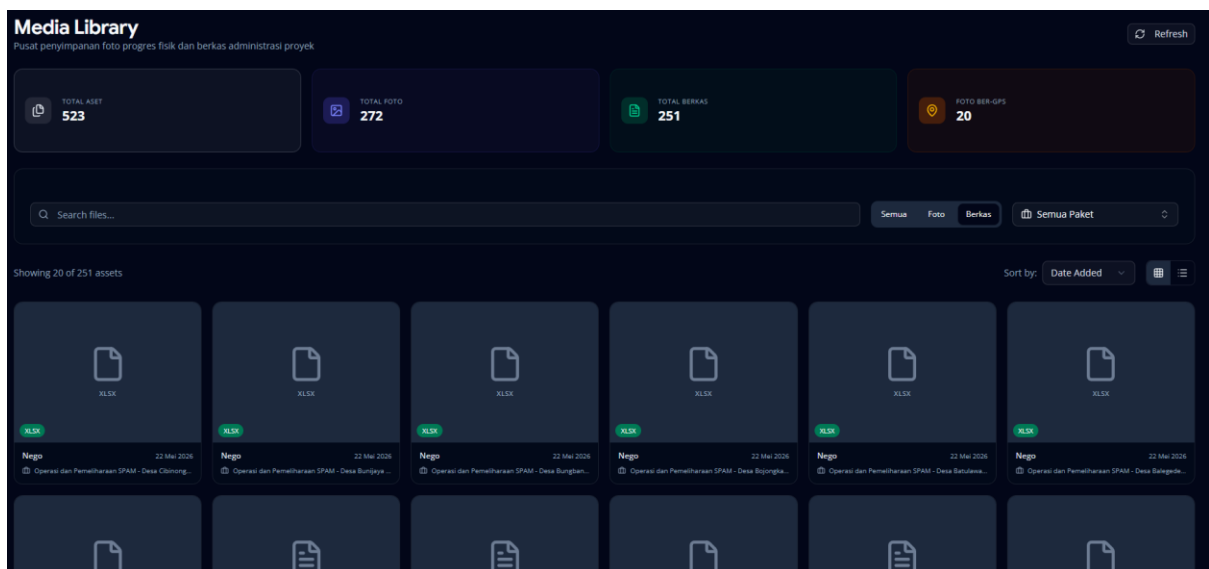

Gambar 10. Manajemen Berkas — /berkas

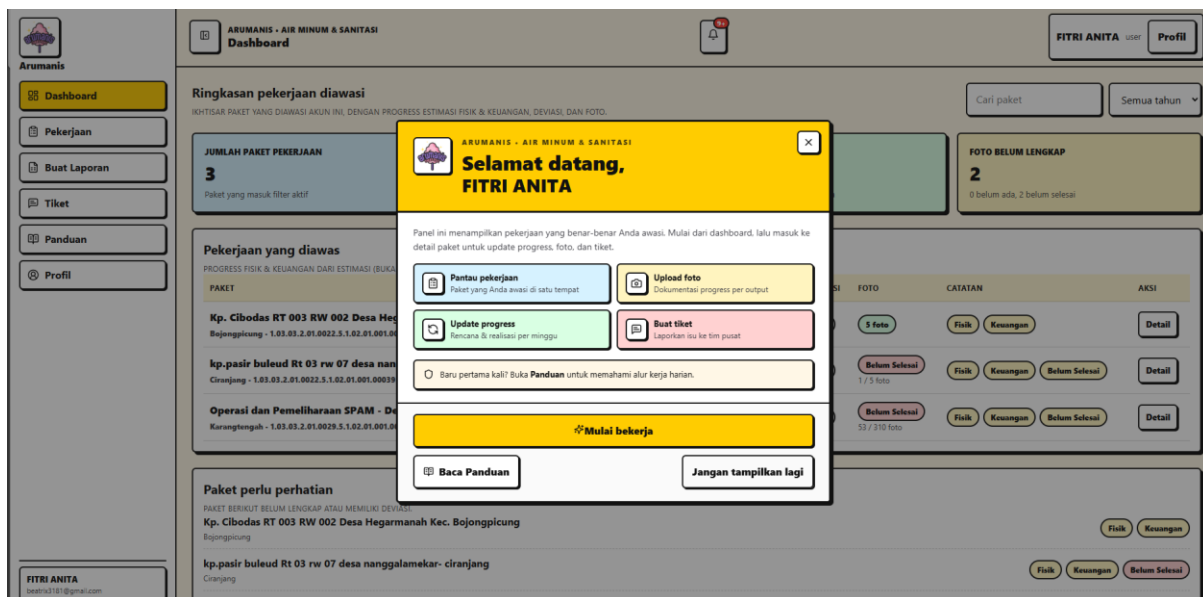

Gambar 11. Panel Pengawasan — Dashboard (impersonate FITRI ANITA, role user pengawas)

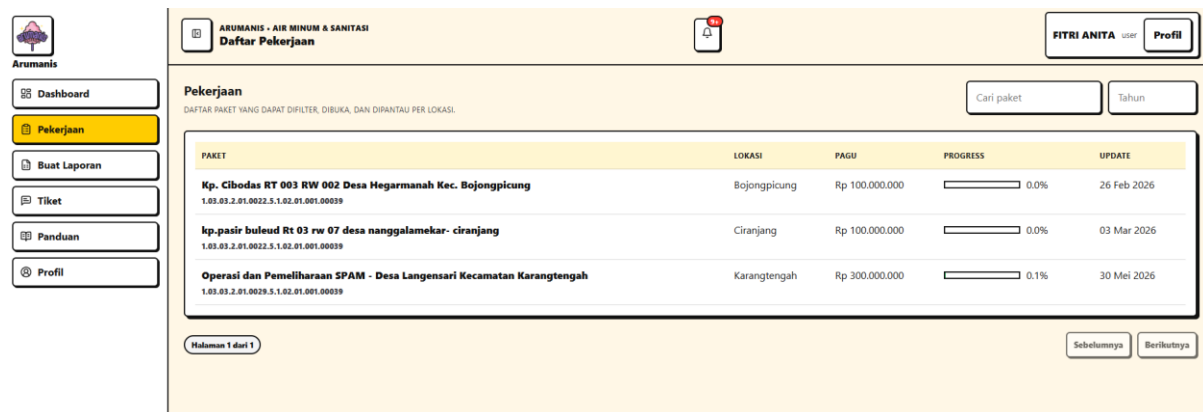

Gambar 12. Panel Pengawasan — Daftar Pekerjaan (/pengawasan/pekerjaan)

Kembali

Buat Laporan Mingguan

Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Langensari Kecamatan Karangtengah

Karangtengah
Langensari

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Progress RAB
0.1%

Pengawas: Fitri Anita

1.03.03.2.01.0029.5.1.02.01.001.00039

TOTAL BOBOT

100.0%

Akumulasi bobot item

DEVIASI

0.0%

Selisih realisasi dengan rencana

PROGRESS TERHITUNG

0.1%

Dari komposisi progress

MINGGU

18

Batas waktu tersedia

Tambah item pekerjaan

TAMBAHKAN ITEM BARU KE DAFTAR LAPORAN

NAMA ITEM

RINCIAN ITEM

SATUAN

TARGET VOLUME

BOBOT (%)

HARGA SATUAN

Contoh: Pekerjaan persiapan

Detail pekerjaan (opsional)

Pilih satuan

0

0

0

+ Tambah item

Reset form

Rincian per minggu

ISI KOLOM RENCANA DAN REALISASI LALU SIMPAN

MINGGU AKTIF

Minggu 1

Simpan

ITEM	SATUAN	TARGET	RENCANA	REALISASI	STATUS
PEKERJAAN PERSIAPAN Pembersihan lokasi	Ls	1	1	1	1.0%
PEKERJAAN PERSIAPAN Direksi keet (sewa)	unit	1	0	0	Belum diisi

Gambar 15. Panel Pengawasan — Buat Laporan mingguan

Kembali

Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Langensari Kecamatan Karangtengah

Belum selesai

manual

Karangtengah

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
TA 2026

Pagu Rp 300.000.000
Progress
0.0%

Pengawas: Fitri Anita

Pendamping:

Dibuat 02 Jan 2026

Ringkasan

Output

Penerima

Foto

Progress

Tiket

Jumlah: 0

Terbuka: 0

Tertutup: 0

Buka halaman tiket

Tambah tiket

MULAI DENGAN MENAMBAHKAN TIKET PERTAMA

SUBJEK

KATEGORI

PRIORITAS

Masukkan subjek tiket

Umum

Rendah

DESKRIPSI

Jelaskan isu, lokasi kejadian, atau tindakan yang dibutuhkan


Buat tiket

Batal


Tiket pekerjaan

DAFTAR TIKET YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN INI

Gambar 16. Panel Pengawasan — Tiket kendala lapangan

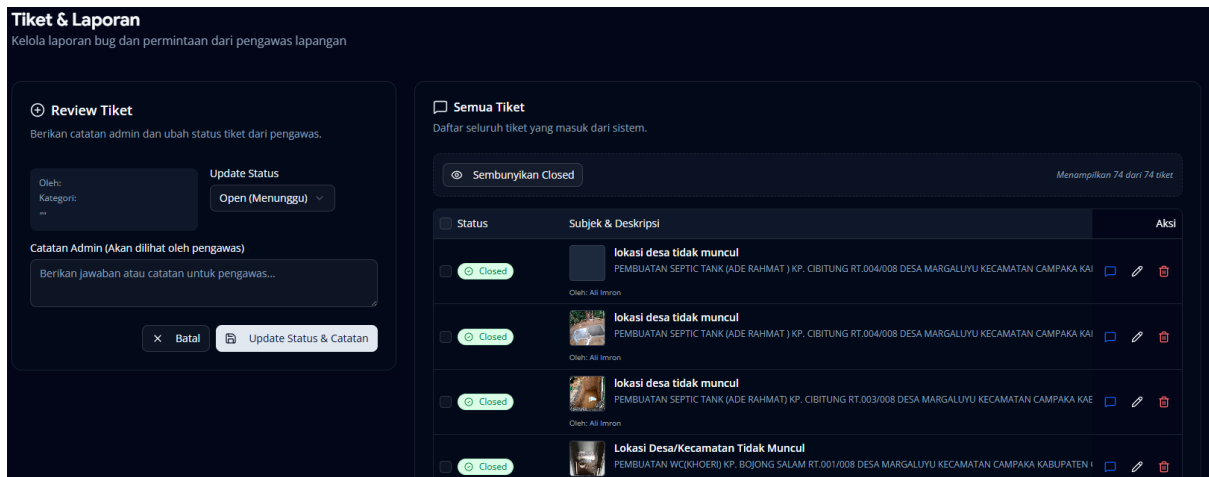

Gambar 17. Tiket & Laporan Arumanis Utama — /tiket

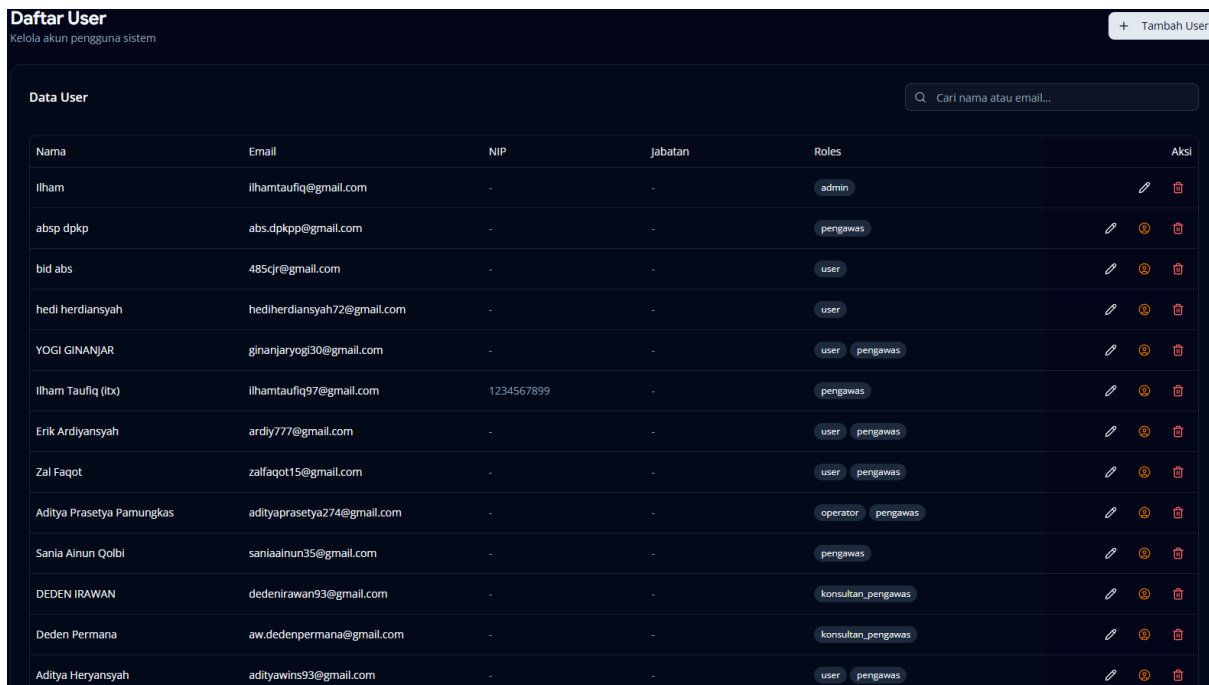

Gambar 18. Manajemen User & tombol Impersonate — /users (admin)

LAMPIRAN B GLOSARIUM SINGKAT

1. ARUMANIS — Air Minum & Sanitasi Cianjur
2. SPAM — Sarana Penyediaan Air Minum
3. SPM — Standar Pelayanan Minimum
4. SPALD-T/S — Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
5. POKMAS — Kelompok masyarakat pengelola unit SPAM
6. Pagu — Anggaran program (Rupiah)
7. Fiscal Year — Tahun anggaran yang dipilih di header
8. SSO — Single Sign-On ke Panel Pengawasan
9. RBAC — Role-Based Access Control
