



PROPOSAL

DIBUAT UNTUK

LID 2026

WWW.ARUMANIS.CIANJUR.SPACE

PROPOSAL LOMBA INOVASI DAERAH ARUMANIS



Air Minum & Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tahun penyusunan: 2026

Alamat aplikasi: arumanis.cianjur.space · apiamis.cianjur.space

Halaman publikasi untuk video singkat tentang arumanis dan dokumen ini, bisa diakses di alamat: <https://arumanis.cianjur.space/publikasi/arumanis-platform-untuk-monitoring-air-minum-sanitasi-H0cMH>

Snapshot data operasional: 27 Juni 2026

Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

RINGKASAN

Arumanis (Air Minum dan Sanitasi) adalah platform *monitoring* pekerjaan konstruksi infrastruktur air minum atau lebih spesifik SPAM perdesaan dan sanitasi—khususnya pengelolaan air limbah—serta pengolahan data real-time di 33 kecamatan dan 365 desa Kabupaten Cianjur. Inti inovasi: memantau progress konstruksi, dokumentasi lapangan memiliki data koordinat, dan rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam satu sistem terintegrasi.

Per 27 Juni 2026, data terhimpun mencatat capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 13,24% (53.206 KK dari 534.952 KK) dan sanitasi 1,90% (9.645 KK dari 507.000 KK). Anggaran terpetakan. Terdapat 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 162 infrastruktur sanitasi, dan 29 pengawas aktif.

Gap intervensi: 481.746 KK belum terlayani air minum dan 261 desa belum memiliki infrastruktur sanitasi terpetakan (104 desa sudah). Data masih disinkronkan sejak 2017 dan mungkin mengandung kesalahan—angka bersifat progresif, bukan final.

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum

Inovasi Arumanis berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (kaitan sanitasi lingkungan).

Bidang air minum: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan SPAM; Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Pengembangan SPAM. Bidang sanitasi: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2014 tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan; Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Air Limbah Domestik.

Tata kelola digital: Permendagri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penerapan SPBE; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Tingkat daerah: Perda Kab. Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 (Perumdam Tirta Mukti); Perda Nomor 1 Tahun 2021 (penyertaan modal); Perda Nomor 18 Tahun 2021 (susunan perangkat daerah); Perbup Nomor 102 Tahun 2021 (tugas-fungsi DPKP); Perbup Nomor 23 Tahun 2020 (RAD PAMSIMAS 2019–2023); RPJMD 2025–2029; Kajian RISPAM Kabupaten Cianjur.

Inti Arumanis adalah platform pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi infrastruktur SPAM perdesaan serta pekerjaan sanitasi, khususnya pada bidang pengelolaan air limbah (SPALD-T, SPALD-S, IPLT, dan infrastruktur terkait). Pekerjaan-pekerjaan ini tersebar di 33 kecamatan dan 365 desa/kelurahan Kabupaten Cianjur, dengan pelaksana yang melibatkan dinas, pengawas lapangan, konsultan, kontraktor, dan pengelola desa.

Sebelum hadirnya Arumanis, pemantauan progres fisik, keuangan, dan dokumentasi lapangan banyak dilakukan secara manual. Laporan konstruksi SPAM dan sanitasi kerap dikirim melalui berkas Excel, dokumen cetak, atau pesan instan tanpa jejak terpusat. Akibatnya, deviasi pekerjaan—misalnya keterlambatan progress fisik, ketidaksesuaian output, atau kekurangan dokumentasi—baru terdeteksi setelah periode pelaporan berakhir.

Di luar fungsi monitoring konstruksi infrastruktur, Arumanis mengolah data secara real-time: dashboard, rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), peta per desa, ekspor

laporan, statistik pengawas, dan publikasi kepada masyarakat. Arumanis bukan sekadar repositori arsip, melainkan sistem kerja yang menghubungkan lapangan dan kantor pusat.

Basis data masih dalam proses sinkronisasi dari berbagai sumber dari tahun 2017. *Scan* ulang menemukan jejak capaian SPAM dari tahun 2009 dari impor arsip historis. Data dihimpun dari *Excel/CSV*, input operator, modul pekerjaan, capaian unit SPAM, dokumentasi Panel Pengawasan, SPSE LKPP, dan sumber lain—belum seluruhnya harmonis. Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah dihimpun per 27 Juni 2026: bidang air minum 53.206 KK / 266.020 jiwa (13,24% dari target 534.952 KK); bidang sanitasi 9.645 KK / 48.225 jiwa (1,90% dari target 507.000 KK).

Inventaris infrastruktur terkumpul: 558 pekerjaan konstruksi (kumulatif), 466 kontrak; 364 unit SPAM (33 SIMSPAM); 162 infrastruktur sanitasi (56 SPALD-T, 105 SPALD-S, 1 IPLT) di 104 desa; 508 record capaian tahunan; 6.168 foto dokumentasi.

Urgensi gap: 481.746 KK (86,76% populasi target) belum tercapai untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum; 497.355 KK (98,10% target) belum memanfaatkan sanitasi layak, dengan 261 desa tanpa infrastruktur terpetakan.

Peta anggaran terhimpun (*snapshot*, dapat berubah saat sinkronisasi dan harmonisasi data): air minum—nilai kontrak/unit SPAM Sekian miliar; sanitasi—investasi infrastruktur Sekian miliar; pekerjaan konstruksi lintas bidang—pagu Sekian miliar, kontrak Sekian miliar; pengawasan—Sekian miliar. Total investasi air minum + sanitasi ~Sekian miliar. Contoh ketidakselarasan data yang sedang diverifikasi: penghitungan jenis infrastruktur SPALD-S antar modul masih berbeda selama proses sinkronisasi.

1.2 Rekapitulasi Data yang Telah Dihimpun Arumanis

Arumanis telah menghimpun data operasional dari berbagai sumber. Proses sinkronisasi dimulai dari data pekerjaan tahun 2017, namun impor capaian unit SPAM memuat jejak historis hingga tahun 2009. Berikut ringkasan data terkumpul per 27 Juni 2026.

Capaian SPAM per tahun (dari 508 *record achievement*): tahun 2009 (1 *record* capaian, 1 unit, 218 KK / 1.088 jiwa); tahun 2014 (1 *record* capaian, 1 unit, 215 KK / 1.075 jiwa); tahun 2020 (63 *record* capaian, 63 unit, 13.125 KK / 65.607 jiwa); tahun 2021 (59 *record* capaian, 59 unit, 10.696 KK / 53.433 jiwa); tahun 2022 (61 *record* capaian, 61 unit, 10.312 KK / 51.546

jiwa); tahun 2023 (55 *record* capaian, 55 unit, 5.920 KK / 29.601 jiwa); tahun 2024 (192 *record* capaian, 192 unit, 5.093 KK / 25.479 jiwa); tahun 2025 (71 *record* capaian, 71 unit, 7.552 KK / 37.828 jiwa); tahun 2026 (5 *record* capaian, 5 unit, 75 KK / 363 jiwa). Rekaman ini mencerminkan perkembangan pelaporan capaian layanan dari unit-unit SPAM perdesaan lintas periode, bukan sekadar data tahun berjalan.

Monitoring pekerjaan konstruksi per tahun anggaran: 2024: 183 pekerjaan, 145 kontrak, pagu Sekian miliar; 2025: 241 pekerjaan, 225 kontrak, pagu Sekian miliar; 2026: 134 pekerjaan, 96 kontrak, pagu Sekian miliar. Total kumulatif seluruh tahun: 558 pekerjaan, 223 output fisik, 1.280 penerima manfaat, pagu pekerjaan Sekian miliar. Modul kegiatan aktif mencakup tahun 2026, 2025, 2024.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) per bidang: air minum 13,24% (53.206 dari 534.952 KK target); sanitasi 1,90% (9.645 dari 507.000 KK target). Anggaran: air minum Sekian miliar, sanitasi Sekian miliar, pengawasan Sekian miliar. Data tahun 2017–2023 dari arsip eksternal masih diharmonisasi—angka dapat berubah atau mengandung kesalahan.

Kebutuhan akan platform semacam ini semakin mendesak seiring tuntutan digitalisasi dan integrasi data, transparansi publik, dan program peningkatan akses air minum serta sanitasi layak yang selaras SDGs 6, RPJMD, RISPAM, dan RAD PAMSIMAS. Arumanis hadir untuk menjawab kebutuhan monitoring konstruksi yang terukur, disertai kemampuan olah data real-time bagi berbagai keperluan pengambilan keputusan.

BAB II RANCANG BANGUN

2.1 Metode Pembaharuan

Metode pembaharuan inovasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Arumanis. Kondisi sebelum inovasi menggambarkan praktik pemantauan pekerjaan konstruksi SPAM dan Sanitasi yang masih berbasis dokumen terpisah. Kondisi sesudah inovasi mengacu pada data operasional Arumanis yang diperbarui secara berkala, dengan catatan bahwa proses sinkronisasi data historis sejak 2017 masih berlangsung sehingga capaian kuantitatif bersifat progresif.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah (Terukur)

Integrasi data: sebelumnya 4–6 format terpisah (*Excel*, *PDF*, *WhatsApp*, berkas fisik); sesudahnya satu platform Arumanis. Rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) lintas 365 desa: dari 5–10 hari kerja menjadi kurang dari 1 hari. Unit SPAM terdigitalisasi: 364 unit dengan 508 *record* capaian multi-tahun.

Monitoring infrastruktur: sebelumnya tidak terstandar per berkas; sesudahnya 558 paket pekerjaan terpantau. Interval laporan pengawas: dari 2–4 minggu menjadi laporan mingguan *via* Panel Pengawasan. Dokumentasi foto: dari tersebar di perangkat pengawas menjadi 6.168 foto terindeks mempunyai *history progress* dan data koordinat.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM): sebelumnya rekaman per unit di *Excel* terpisah; sesudahnya air minum 13,24% (53.206 KK) dan sanitasi 1,90% (9.645 KK) divisualisasikan peta sebaran 365 desa, dapat diakses publik 24 jam. Impor data massal SPAM: dari 3–5 hari menjadi kurang dari 2 jam. Laporan *PDF/Excel*: dari 1–2 hari menjadi kurang dari 30 menit.

Pengambilan keputusan: sebelumnya manual pivot tabel; sesudahnya dashboard real-time, filter 33 kecamatan × 365 desa × tahun, indikator kualitas data, tercatat di SIMSPAM (33 unit), dan asisten Ami AI untuk penafsiran data operasional (masih dalam tahap pengembangan).

Monitoring Pekerjaan Konstruksi SPAM Perdesaan

Sebelum inovasi, progres fisik pembangunan, rehabilitasi, dan operasional SPAM perdesaan sulit dipantau secara terpusat. Pengawas mengirim foto dan laporan secara terpisah, sementara kantor pusat menyusun rekapitulasi manual lintas kecamatan.

Setelah inovasi, pekerjaan konstruksi SPAM dipantau melalui modul pekerjaan dan Panel Pengawasan terintegrasi. Tercatat 558 pekerjaan dengan 466 kontrak, 6.168 dokumentasi foto terindeks, dan 29 pengawas aktif di 33 lokasi. Progress fisik diisi mingguan melalui slot foto 0%–100% berkoordinat GPS; deviasi terhadap rencana terlihat di dashboard. Modul SPAM Unit (364 unit, 508 record capaian multi-tahun) menjadi acuan monitoring layanan pasca-konstruksi.

Monitoring Pekerjaan Sanitasi dan Air Limbah

Pada bidang sanitasi, fokus Arumanis terutama pada pengawasan pekerjaan dan operasional infrastruktur pengelolaan air limbah perdesaan—meliputi pembangunan dan pemanfaatan SPALD-T, SPALD-S, IPLT, serta unit terkait. Sebelum inovasi, data pemanfaat dan status infrastruktur air limbah belum terhubung dengan pemantauan progres konstruksi.

Setelah Arumanis, 162 infrastruktur sanitasi terdata dengan 104 desa memiliki infrastruktur terpetakan. Capaian pemanfaat mencapai 9.645 KK dan 48.225 jiwa, dengan nilai investasi terkonsolidasi Sekian miliar. Peta capaian publik memungkinkan pemantauan visual per desa untuk keperluan evaluasi program air limbah dan sanitasi. Sebagian data historis sanitasi masih dalam tahap penyelarasan dengan sumber laporan 2017 ke atas.

Pengolahan Data *Real-Time* untuk Keperluan Operasional

Keunggulan pembaharuan berikutnya adalah kemampuan Arumanis mengolah data secara *real-time* sesuai kebutuhan pengguna. *Dashboard* menampilkan ringkasan kegiatan, pekerjaan, kontrak, output, pagu, distribusi sumber dana (DAK, APBD, DAU, PAD), dan indikator kualitas data tanpa menunggu rekapitulasi manual. Asisten Ami AI membantu penafsiran data operasional; laporan *PDF/Excel* dihasilkan dari data yang sama dengan Panel Pengawasan.

Contoh keperluan *real-time*: memantau 558 pekerjaan dan 223 output, melacak 1.280 penerima manfaat, mengecek kelengkapan koordinat/foto, menyiapkan evaluasi SPM (53.206 KK), serta mempublikasikan capaian melalui peta publik 365 desa. Data historis capaian SPAM (2009–2026) dan pekerjaan tahun 2024–2026 telah terhimpun; sumber eksternal 2017–2023 masih disinkronkan bertahap.

Integrasi Data

Proses sinkronisasi data merupakan bagian penting rancang bangun Arumanis. Data historis berasal dari berbagai sumber: arsip *Excel/CSV* periode 2017 ke atas, input operator, capaian unit SPAM, dokumentasi pengawasan, kontrak pekerjaan, dan integrasi modul sanitasi. Harmonisasi antarsumber dilakukan agar monitoring konstruksi dan capaian SPM tidak lagi terpisah-pisah.

Hingga *snapshot* ini, 508 record capaian SPAM dan data pekerjaan aktif telah terhimpun. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 13,24% dan sanitasi 1,90% akan terus diperbarui seiring sinkronisasi. Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

2.2 Keunggulan

Keunggulan utama Arumanis dibanding sistem sejenis terletak pada fokus monitoring pekerjaan konstruksi SPAM perdesaan dan Sanitasi (khususnya air limbah) dalam satu platform, bukan hanya pencatatan aset statis. Sistem konvensional kerap memisahkan modul proyek, modul SPAM, dan modul sanitasi. Arumanis menghubungkan ketiganya sehingga progress pembangunan, capaian layanan, dan dokumentasi lapangan dapat dibaca dalam satu konteks.

Arumanis juga unggul dalam pengolahan data *real-time*: *dashboard*, peta sebaran 365 desa, filter per kecamatan/desa/tahun, ekspor laporan, dan Panel Pengawasan dengan terpadu.

Pengawas tidak perlu aplikasi terpisah; foto progres, laporan mingguan, dan tiket kendala tercatat dalam sistem yang sama dengan data terpusat.

Kebaharuan teknis meliputi API publik capaian SPM air minum dan sanitasi, modul indikator kualitas data (kelengkapan koordinat, foto, metadata), integrasi SIMSPAM, sinkronisasi progres, history foto dokumentasi, *role-based access* per wilayah, asisten Ami AI, serta pipeline sinkronisasi data historis multi-sumber.

2.3 Ketersediaan SDM

Penyelenggaraan Arumanis melibatkan SDM fungsional. Peran utama meliputi koordinator program air minum dan sanitasi yang memvalidasi prioritas pekerjaan konstruksi, operator data yang memelihara kualitas data SPAM dan sanitasi, pengembang sistem yang mengelola platform dan proses sinkronisasi data, serta jaringan pengawas lapangan.

Bukti adopsi operasional per 27 Juni 2026: 29 pengawas aktif di 33; 558 pekerjaan dan 6.168 dokumentasi foto menandakan sistem telah dipakai untuk input lapangan. Konsultan pengawas dan TFL memverifikasi output. Di desa, pengelola 364 unit SPAM dan POKMAS melaporkan capaian kepada admin. Personil inti kantor (estimasi 5–7 orang) mengoordinasikan input data dan harmonisasi sumber historis.

2.4 Risiko dan Mitigasi

Risiko sinkronisasi data: angka antar sumber belum 100% selaras. Mitigasi: validasi triwulanan operator, penandaan data sumber, modul indikator kualitas data, dan disclaimer transparan pada setiap laporan. Risiko kesalahan input manual: mitigasi validasi *server-side*, template impor *CSV/Excel*, dan *audit log* perubahan.

Risiko ketergantungan operator dan konektivitas lapangan: mitigasi pelatihan berkala, dokumentasi pengguna (*docs/user-guide*), Panel Pengawasan, serta dukungan teknis personil inti. Risiko rendahnya adopsi pengawas: mitigasi integrasi alur kerja mingguan, notifikasi broadcast, dan statistik kelengkapan input oleh pengawas/konsultan/tfl.

2.5 Rencana Pengembangan 2026–2027

(1) Menyelesaikan harmonisasi data historis 2017–2025 dari arsip eksternal. (2) Menautkan pekerjaan konstruksi ke unit SPAM dan infrastruktur sanitasi secara menyeluruh. (3) Memperluas integrasi SIMSPAM dari 33 unit saat ini. (4) Meningkatkan kelengkapan metadata atau tagging GPS/foto menuju target 90% paket aktif. (5) Memperkaya data capaian sanitasi di 261 desa yang belum berinfrastruktur terpetakan.

BAB III TUJUAN

3.1 Target Capaian Penyelenggaraan

Tujuan inovasi Arumanis diarahkan pada terwujudnya pemantauan pekerjaan konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah) yang terukur, disertai kemampuan olah data real-time untuk berbagai keperluan operasional.

Target capaiannya antara lain: (1) seluruh paket konstruksi SPAM dan sanitasi aktif terpantau melalui sistem, saat ini 558 pekerjaan tercatat; (2) pembaruan progres fisik minimal mingguan melalui Panel Pengawasan; (3) dokumentasi foto progres bermetadata GPS minimal 90% paket aktif, dari baseline 6.168 foto terindeks; (4) penyelesaian sinkronisasi data historis 2017–sekarang dengan selisih antarsumber di bawah 5%; (5) dashboard dan peta capaian 365 desa dapat diakses real-time; (6) publikasi capaian SPM dan sanitasi kepada masyarakat tanpa login.

Secara substantif, Arumanis ditargetkan menjadi sistem monitoring konstruksi dan capaian layanan yang menjadi rujukan bersama—dari progress pembangunan SPAM perdesaan, pengelolaan air limbah, hingga rekapitulasi 53.206 KK terlayani air minum dan 9.645 KK pemanfaat sanitasi—dengan data yang terus diselaraskan dari berbagai sumber dari tahun 2017.

BAB IV MANFAAT

4.1 Manfaat yang Diperoleh

Bagi penyelenggara program, manfaat utama adalah terpantauinya progress konstruksi SPAM dan sanitasi secara terpusat. Deviasi fisik maupun keuangan teridentifikasi lebih awal. Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum (13,24%) dan sanitasi (1,90%) serta anggaran terpetakan—air minum Sekian miliar, sanitasi Sekian miliar, pekerjaan Sekian miliar (466 kontrak)—tanpa rekapitulasi manual.

Bagi pengawas dan pelaksana lapangan, alur kerja terstruktur: unggah foto ber-GPS, isi progress mingguan, laporan RAB, dan tiket kendala dalam satu sistem. Data lapangan langsung menjadi bahan dashboard kantor pusat.

Manfaat bagi Bidang Air Minum dan Sanitasi

Kedua bidang memperoleh single source of truth capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di 365 desa. Air minum: target 534.952 KK, capaian 53.206 KK / 266.020 jiwa (13,24%), meliputi 53.131 KK acuan s/d 2025 plus integrasi 75 KK tahun 2026. Sanitasi: target 507.000

KK, pemanfaat 9.645 KK / 48.225 jiwa (1,90%), tersebar di 104 desa berinfrastruktur (56 SPALD-T, 105 SPALD-S, 1 IPLT).

Profil 364 unit SPAM (POKMAS, kapasitas, anggaran) dan 162 infrastruktur sanitasi terdigitalisasi. Air minum: 508 record capaian multi-tahun (2009–2026). Rekapitulasi lintas 33 kecamatan dari 5–10 hari menjadi kurang dari satu hari via filter kecamatan/desa/tahun.

Akuntabilitas anggaran terpetakan seimbang: air minum nilai kontrak/unit Sekian miliar; sanitasi investasi infrastruktur Sekian miliar; pekerjaan konstruksi (lintas bidang) pagu Sekian miliar dan kontrak Sekian miliar; pengawasan Sekian miliar. Monitoring 558 paket (2024: 183 pekerjaan, 145 kontrak, pagu Sekian miliar; 2025: 241 pekerjaan, 225 kontrak, pagu Sekian miliar; 2026: 134 pekerjaan, 96 kontrak, pagu Sekian miliar) menghubungkan progress konstruksi SPAM dan sanitasi dengan capaian layanan pasca-operasional.

Peta sebaran dan API publik capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi dasar penargetan Renja/RKPD, evaluasi RISPAM, dan RAD PAMSIMAS—baik untuk desa prioritas air minum (*coverage* 13,24%) maupun sanitasi (*coverage* 1,90%). Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat memperoleh akses capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum dan sanitasi per desa tanpa login (arumanis.cianjur.space, 24 jam). Dari 2.535.002 jiwa penduduk: air minum 266.020 jiwa terlayani (13,24%), sisa gap 481.746 KK; sanitasi 48.225 jiwa pemanfaat (1,90%) di 104 desa, sementara 261 desa belum berinfrastruktur terpetakan.

Warga dapat memverifikasi unit SPAM, persentase capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum, serta infrastruktur SPALD-T/SPALD-S/IPLT di desanya—tanpa ke kantor dinas. Dokumentasi 6.168 foto progres ber-GPS memperkuat kredibilitas pelaporan konstruksi air minum maupun sanitasi.

Aparatur desa, POKMAS, dan pengelola unit memperoleh dasar data bersama evaluasi kinerja layanan. Manfaat jangka panjang: percepatan akses air minum layak dan sanitasi/air limbah—selaras SDGs 6 dan penurunan stunting. Investasi terpetakan: air minum Sekian miliar, sanitasi Sekian miliar—dapat dipertanggungjawabkan karena progress konstruksi terlacak hingga operasional. Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai

sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

4.2 Penerima Manfaat Inovasi

Penerima manfaat langsung: masyarakat di 33 kecamatan dan 365 desa. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 53.206 KK (266.020 jiwa, 13,24%); sanitasi 9.645 KK (48.225 jiwa, 1,90%) di 104 desa.

Pengawas (29 orang), konsultan, kontraktor, operator, pengelola 364 unit SPAM, dan POKMAS merupakan penerima manfaat operasional. Publik akses capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) 24 jam. Manfaat menjangkau 2.535.002 jiwa penduduk; prioritas intervensi di desa coverage air minum dan sanitasi terendah.

BAB V HASIL

Hasil penyelenggaraan inovasi Arumanis per 27 Juni 2026 berupa produk digital yang mendukung monitoring konstruksi dan pengolahan data real-time, sebagai berikut.

Platform Arumanis Utama (*arumanis.cianjur.space*) meliputi *dashboard* monitoring pekerjaan, modul kegiatan dan kontrak, SPAM Unit, indikator kualitas data, sistem notifikasi, dan asisten Ami AI (masih dalam tahap pengembangan). Panel Pengawasan Terintegrasi (*/pengawasan/*) menjadi sarana utama pengawas memantau progress konstruksi, mengunggah dokumentasi, dan menyusun laporan mingguan dengan login dari akun yang sama.

Backend api amis (*apiamis.cianjur.space*) menjadi pusat penyimpanan dan validasi data. Puspen tersedia sebagai alat tambahan (arsip PDF, TTD digital, progress fisik review, media *sharing*, statistik pengawas) untuk keperluan operasional pendukung. Halaman publik menampilkan peta capaian SPM dan sanitasi per desa. Basis data terintegrasi memuat 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 162 infrastruktur sanitasi, 6.168 foto, dan 508 record capaian (2009–2026)—sinkronisasi data dari tahun 2017 masih berlangsung.

Ringkasan hasil per 27 Juni 2026: 558 pekerjaan, 466 kontrak, 29 pengawas. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 53.206 KK (13,24%); sanitasi 9.645 KK (1,90%). Anggaran: air minum Sekian miliar, sanitasi Sekian miliar, pekerjaan Sekian miliar, pengawasan Sekian miliar.


Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi

belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.


Dokumen umum ini menggambarkan Arumanis sebagai inovasi monitoring konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah), dilengkapi pengolahan data real-time. Dokumen diperbarui seiring sinkronisasi data.

Lampiran Bukti Visual


Cuplikan layar berikut diambil dari lingkungan produksi arumanis.cianjur.space per Juni 2026 sebagai bukti visual implementasi inovasi. Gambar melengkapi narasi monitoring konstruksi dan capaian SPM air minum serta sanitasi.

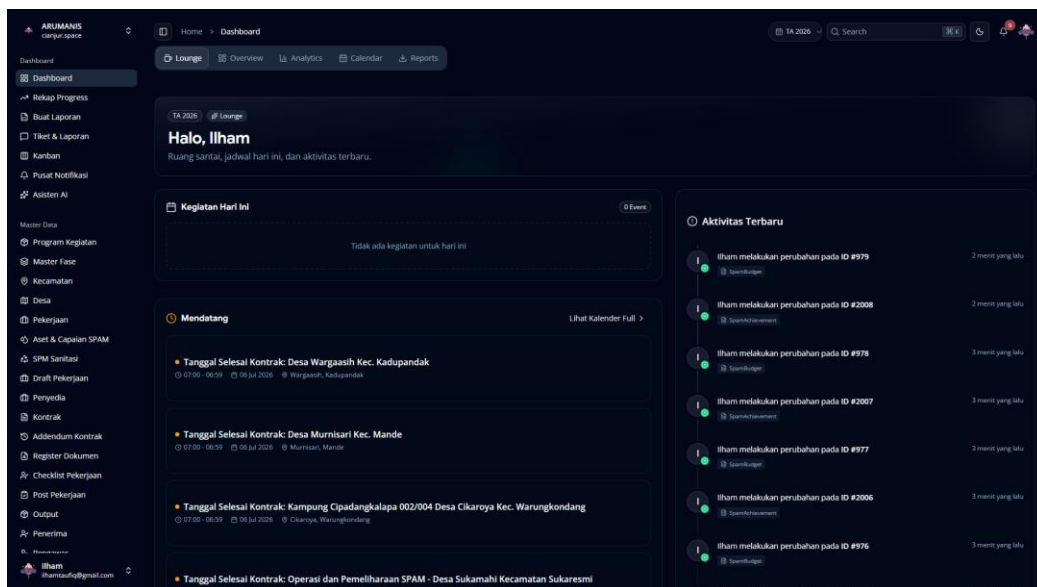

Gambar 1. Dashboard monitoring pekerjaan konstruksi air minum dan sanitasi (arumanis.cianjur.space).

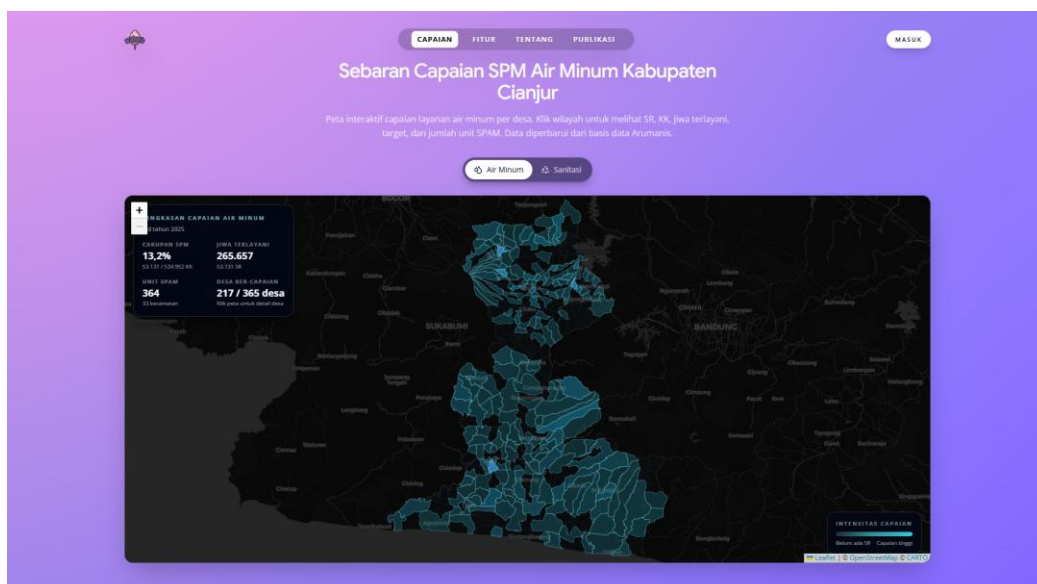

Gambar 2. Peta capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum per desa.

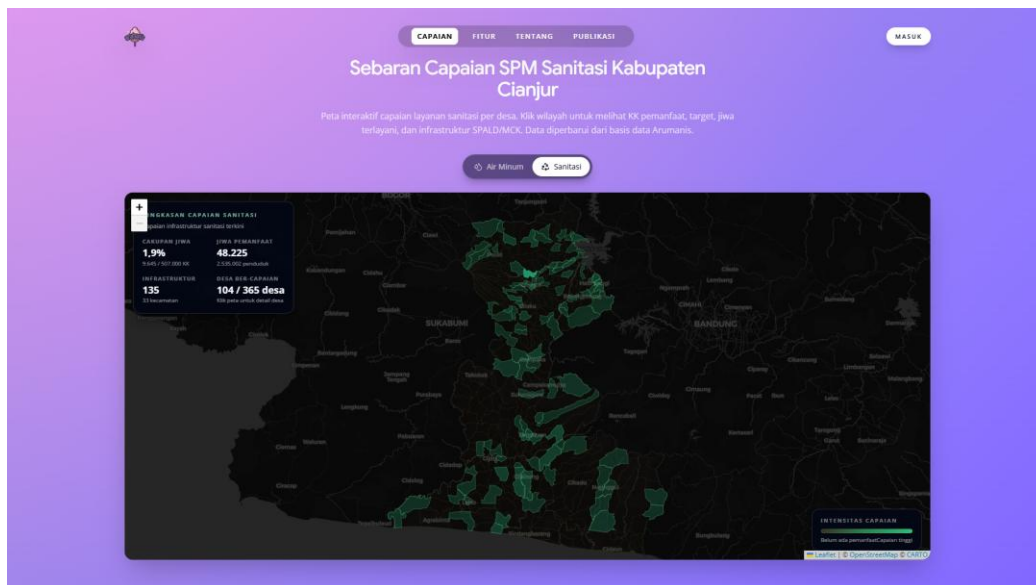

Gambar 3. Peta capaian SPM sanitasi dan air limbah per desa.

Gambar 4. Panel Pengawasan terintegrasi untuk input progress dan dokumentasi lapangan.

Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.



PANDUAN

DIBUAT UNTUK

LID 2026

WWW.ARUMANIS.CIANJUR.SPACE

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ARUMANIS



Air Minum & Sanitasi Kabupaten Cianjur

Dokumen Panduan Operasional untuk Admin, Operator, dan Pengawas

Versi dokumen: 1.0 · Juni 2026

Alamat aplikasi: <https://arumanis.cianjur.space>

Halaman publikasi untuk video singkat tentang arumanis dan dokumen ini, bisa diakses di alamat:

<https://arumanis.cianjur.space/publikasi/arumanis-platform-untuk-monitoring-air-minum-sanitasi-H0cMH>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tentang Aplikasi

ARUMANIS (Air Minum & Sanitasi Cianjur) adalah aplikasi monitoring kegiatan-kegiatan Pekerjaan di bidang Air Minum dan Sanitasi. Aplikasi digunakan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kontrak, dokumentasi lapangan, pelaporan progress, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan pemantauan oleh pengawas.

Aplikasi terdiri dari dua bagian utama:

1. Arumanis Utama (/) — kantor pusat: master data, dashboard, kontrak, berkas, administrasi akses
2. Panel Pengawasan (/pengawasan/) — aplikasi lapangan untuk pengawas dan konsultan pengawas

1.2 Persyaratan Sistem

1. Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru
2. Koneksi internet stabil
3. Akun aktif (email dan password dari administrator)
4. Perangkat mobile/desktop dengan resolusi layar minimal 1280×720 (disarankan)

1.3 Cara Mengakses

1. Buka browser dan kunjungi <https://arumanis.cianjur.space>
2. Halaman Sign In (/sign-in) akan tampil jika belum login
3. Masukkan email dan password, lalu klik SIGN IN
4. Alternatif: tombol GOOGLE untuk login OAuth (jika diaktifkan admin)
5. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke Dashboard atau Panel Pengawasan sesuai role

BAB II NAVIGASI DAN ANTARMUKA

2.1 Tata Letak Halaman

Setelah login, tampilan Arumanis Utama terdiri dari Header (atas), Sidebar (kiri), dan Area Konten Utama. Header berisi logo, pemilih tahun anggaran (*Fiscal Year*), pencarian global (Ctrl+K), toggle tema terang/gelap, notifikasi, dan menu pengguna. Sidebar menampilkan modul sesuai hak akses role.

2.2 Menu Sidebar (Arumanis Utama)

Dashboard & Layanan

1. Dashboard (/dashboard) — ringkasan metrik dan grafik
2. Rekap Progress (/progress_rekap) — progress pekerjaan
3. Tiket & Laporan (/tiket) — pelaporan masalah
4. Pusat Notifikasi (/notifications)
5. Asisten AI (/chat) — Ami AI untuk penafsiran data

Master Data

1. Program Kegiatan (/kegiatan)
2. Kecamatan (/kecamatan) · Desa (/desa)
3. Pekerjaan (/pekerjaan) · Draft Pekerjaan (/draft-pekerjaan)
4. Aset & Capaian SPAM (/spam-unit) · SPM Sanitasi (/spm-sanitasi)
5. Penyedia (/penyedia) · Kontrak (/kontrak) · Addendum (/kontrak-addendums)
6. Output (/output) · Penerima (/penerima) · Pengawas (/pengawas)

Dokumentasi & Visualisasi

1. Foto (/foto) · Berkas (/berkas)
2. Peta Progress (/map) — peta sebaran pekerjaan
3. Simulasi Jaringan (/simulation)
4. Manajemen Publikasi (/manajemen-publikasi)

Akses & Pengaturan (Admin)

1. Users, Roles, Permissions, Route Permissions, Menu Permissions
2. Audit Trail, Settings, Assign Pekerjaan, Broadcast Notifikasi, WhatsApp

2.3 Komponen UI Dasar

Gunakan tombol primary untuk aksi utama (Simpan, Tambah), destructive untuk hapus, dan dialog konfirmasi sebelum aksi tidak dapat dibatalkan. Tabel mendukung sorting (klik header), pagination, dan filter. Form memakai validasi real-time; pesan error tampil di bawah field atau sebagai toast di pojok kanan atas.

BAB III MODUL UTAMA

3.1 Dashboard (/dashboard)

Dashboard menampilkan statistik kegiatan, pekerjaan, kontrak, output, penerima, dan indikator kualitas data. Pilih tahun anggaran di header untuk memfilter seluruh widget. Tab tersedia: Lounge, Overview, Analytics, Calendar, Reports.

1. KegiatanStats: total kegiatan, pagu, pekerjaan, kontrak, output, penerima
2. Grafik: kegiatan per tahun, sumber dana, pekerjaan per kecamatan/desa
3. Data Quality Stats: pekerjaan tanpa koordinat, foto, atau kontrak

3.2 Program Kegiatan (/kegiatan)

Kegiatan adalah program induk dengan pagu anggaran dan sumber dana (APBD, APBN, lainnya).

1. Klik Tambah Kegiatan → isi nama, kode (unik), sumber dana, pagu, tahun
2. Simpan → kegiatan dapat ditautkan ke pekerjaan
3. Edit/Hapus via ikon di baris tabel (hapus diblokir jika masih memiliki pekerjaan terkait)

3.3 Pekerjaan & Output

Pekerjaan (/pekerjaan) adalah proyek turunan kegiatan di tingkat kecamatan/desa.

1. Tambah Pekerjaan: pilih kegiatan, kecamatan, desa, isi kode unik, pagu, tahun
2. Output (/output): catat hasil fisik per pekerjaan (volume, satuan, realisasi)
3. Draft Pekerjaan: pekerjaan belum final → publikasikan menjadi aktif

3.4 Kontrak & Penyedia

Kontrak (/kontrak) menghubungkan pekerjaan dengan penyedia/vendor.

1. Pastikan pekerjaan dan penyedia sudah terdaftar
2. Tambah Kontrak: nomor unik, nilai, tanggal mulai/selesai, status
3. Addendum (/kontrak-addendums): perubahan nilai, waktu, atau ruang lingkup

3.5 Penerima Manfaat (/penerima)

Kelola data penerima individu atau komunal. Filter berdasarkan kecamatan/desa atau cari via NIK/nama. Klik baris untuk melihat detail lengkap.

3.6 SPAM Unit (/spam-unit)

Modul unit Sarana Penyediaan Air Minum perdesaan. Mencatat kapasitas, pengelola (POKMAS), capaian SR/KK/jiwa, integrasi SIMSPAM, dan rencana anggaran. Mendukung impor data massal CSV/Excel.

3.7 SPM Sanitasi (/spm-sanitasi)

Pemantauan infrastruktur sanitasi (SPALD-T, SPALD-S, IPLT) dan capaian pemanfaat per desa. Gunakan filter kecamatan, desa, dan tahun untuk evaluasi program air limbah.

3.8 Berkas & Foto

Berkas (/berkas): unggah dokumen PDF, DOC, XLS terkait pekerjaan (kontrak, laporan, RAB).

Foto (/foto): galeri dokumentasi umum per pekerjaan (JPG, PNG, WebP).

Catatan: pengawas lapangan mengunggah foto progress ber-slot (0%–100%) dan ber-GPS melalui Panel Pengawasan, bukan modul /foto utama.

3.9 Peta Progress (/map)

Visualisasi geografis sebaran pekerjaan dan progress di peta digital. Gunakan untuk review spasial lintas 33 kecamatan dan 365 desa/kelurahan.

3.10 Halaman Publik

Landing page (/) menampilkan capaian SPM air minum dan sanitasi per desa tanpa login — peta choropleth interaktif di bagian #capaian-spm. Publikasi tersedia di /publikasi.

BAB IV PANEL PENGAWASAN

4.1 Akses dan SSO

Panel Pengawasan tidak memiliki form login terpisah. Pengguna dengan role pengawas atau konsultan_pengawas login di /sign-in Arumanis, lalu diarahkan otomatis ke /pengawasan/ via SSO (token handoff → cookie pengawas_session).

Admin dan manager tetap di Arumanis utama. Admin dapat impersonate pengawas dari halaman Users (tombol Impersonate pada baris user) untuk meninjau tampilan lapangan —

browser diarahkan ke /pengawasan/login?code=... lalu masuk dashboard panel atas nama pengawas tersebut.

Cuplikan layar Panel Pengawasan dalam Lampiran A diambil dengan impersonate akun FITRI ANITA (beatrix3181@gmail.com, role user pengawas) dari akun admin.

4.2 Menu Panel Pengawasan

1. Dashboard — ringkasan dan paket perlu perhatian
2. Pekerjaan — daftar paket yang ditugaskan
3. Buat Laporan — input rencana dan realisasi mingguan (RAB)
4. Tiket — laporan kendala lapangan
5. Notifikasi · Panduan · Profil

4.3 Detail Pekerjaan (6 Tab)

1. Ringkasan — kegiatan, lokasi, pagu, status foto
2. Output — komponen pekerjaan
3. Penerima — data individu/komunal, NIK, jumlah jiwa
4. Foto — matriks output × slot 0%, 25%, 50%, 75%, 100% (GPS wajib)
5. Progress — estimasi fisik dan keuangan mingguan
6. Tiket — kendala terkait paket

4.4 Alur Kerja Pengawas Mingguan

1. Login → masuk Panel Pengawasan
2. Buka pekerjaan → tab Foto → unggah slot progress yang kosong
3. Tab Progress / Buat Laporan → isi rencana dan realisasi minggu ini
4. Jika ada kendala → buat Tiket
5. Verifikasi status paket: Belum ada foto / Belum Selesai / Selesai

BAB V MANAJEMEN AKSES

5.1 Peran Pengguna

1. Admin — akses penuh, kelola user/role, impersonasi, bypass route permission
2. Operator — tambah/edit data di wilayah tugas, upload berkas/foto
3. Viewer — hanya melihat data
4. Pengawas / Konsultan Pengawas — Panel Pengawasan via SSO

5.2 Route Permission

Admin dapat membatasi akses route per role di menu Route Permissions. Admin selalu bypass. Jika menu tidak muncul di sidebar, kemungkinan route permission atau menu permission membatasi role Anda — hubungi administrator.

5.3 Logout

1. Klik avatar/nama di header → Logout
2. Session berakhir → otomatis kembali ke /sign-in
3. Panel Pengawasan: logout sidebar → kembali ke /sign-in Arumanis

BAB VI SKENARIO PENGGUNAAN

6.1 Input Kegiatan Baru + Pekerjaan + Dokumentasi

1. Login → Dashboard
2. Kegiatan → Tambah (nama, kode, sumber dana, pagu)
3. Pekerjaan → Tambah (kegiatan, kecamatan, desa)
4. Output → Tambah hasil fisik
5. Berkas/Foto → unggah dokumentasi
6. Dashboard → verifikasi metrik terupdate

6.2 Kontrak Baru

1. Pastikan pekerjaan dan penyedia terdaftar
2. Kontrak → Tambah → isi nomor, nilai, tanggal
3. Addendum bila ada perubahan kontrak

6.3 Review Progress

1. Dashboard → pilih tahun anggaran
2. Rekap Progress / Peta Progress / modul Foto
3. Perbaiki gap dari Data Quality Stats

6.4 Manajemen User (Admin)

1. Roles → pastikan role tersedia
2. Route Permissions → atur akses
3. Users → Tambah akun (nama, email, password, role)
4. Assign Pekerjaan (opsional)

BAB VII PEMECAHAN MASALAH

7.1 Masalah Login

1. Invalid email or password — periksa kredensial
2. Session expired / 401 — login ulang
3. Account inactive — hubungi admin

7.2 Error Akses

1. 403 Forbidden — role tidak memiliki izin; hubungi admin
2. 404 Not Found — periksa URL atau data sudah dihapus

7.3 Upload Gagal

1. File terlalu besar — kompres (batas umum 5–10 MB)
2. Tipe tidak didukung — gunakan JPG/PNG/PDF/DOC/XLS
3. Gagal upload — cek koneksi, coba refresh

7.4 Panel Pengawasan

1. Loop redirect token — pastikan build terbaru; masuk lewat /sign-in Arumanis
2. 401 di panel — klik Masuk ulang
3. GPS gagal — izinkan lokasi browser atau isi koordinat manual
4. Progress tidak tersimpan — pastikan ada perubahan Rencana/Realisasi

7.5 Langkah Umum

1. Refresh halaman (F5)
2. Logout → login ulang
3. Coba browser lain atau clear cache atau mode incognito
4. Hubungi administrator

LAMPIRAN A CUPLIKAN LAYAR

Gambar berikut diambil dari lingkungan produksi <https://arumanis.cianjur.space> per Juni 2026. Modul Arumanis Utama diambil dengan akun admin; Panel Pengawasan (Gambar 11–16) diambil setelah admin melakukan Impersonate pada user FITRI ANITA (role pengawas).

The screenshot shows the login interface for Arumanis. At the top is the Arumanis logo. Below it is a white box with a black border containing the login form. The form has a title 'MASUK' and a subtitle 'Masukkan email dan password Anda'. It includes an 'EMAIL' field with the placeholder 'name@example.com', a 'PASSWORD' field with masked characters and a 'LUPA?' link, and a yellow 'SIGN IN' button. Below the button is an 'ATAU' separator and a 'GOOGLE' login button. At the bottom, there is a link to 'PANDUAN PENGGUNAAN' and a footer with the text 'ARUMANIS Air Minum & Sanitasi Cianjur'.

Gambar 1. Halaman masuk (Sign In) — /sign-in



Gambar 2. Dashboard — ringkasan metrik program

Home

Program Kegiatan

TA 2026

Search

Daftar Kegiatan

Kelola data kegiatan dan anggaran

Tambah Kegiatan

Data Kegiatan

Program	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aksi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Peng	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Stratu	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sanitasi	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sanitasi	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Unit pengolahan setempat	

Gambar 3. Program Kegiatan — /kegiatan

Daftar Pekerjaan

Kelola data pekerjaan dan paket

Ekspor PDF

Ekspor Excel

Tambah

Data Pekerjaan

Cari pekerjaan...

Filter Kecamatan: Semua Kecamatan

Filter Sub Kegiatan: Semua Sub Kegiatan

Filter Tag: Semua Tag

Filter Pengawas: Semua Pengawas

Urutkan: Terbaru

Turun

Nama Paket	Sub Kegiatan	Kecamatan	Desa	Pengawas	Pendamping	Aksi
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 3 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Ilham	Belum Ada	
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 1 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 2 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultansi Pekerjaan Kebijakan dan Strategi Daerah (jakStada) Penyedia Air Minum 1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.008.00008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
DED Pembangunan IPLT 1.03.05.2.01.0044.5.1.02.02.008.00008	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Konsultan Kegiatan Study EHRA 1.03.05.2.01.0044.5.1.02.01.001.00039	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Sukamulya Kecamatan Cikadu 1.03.03.2.01.0029.5.1.02.01.001.00039	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Cikadu	Sukamulya	Konsultan Paket 3	Uwet	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 4 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 3 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Pengawasan Paket 2 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	
Jasa Konsultan Perencanaan Paket 1 1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.001.00039	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Cianjurkab	NULLs	Belum Ada	Belum Ada	

Gambar 4. Daftar Pekerjaan — /pekerjaan

Kontrak

Kelola data kontrak pekerjaan

TemplateImpor XLSXTambah Kontrak

Daftar Kontrak (96)Ekspor ExcelCari kontrak...

Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak	No/Tgl SPK	Aksi
Kp.Pataruman Rt.01.02.03 Rw.10 dan Rt.03 Rw.08 Desa Kawung Luwuk Kec. Sukaresmi	Rp 100.000.000	DAU	CV. PUTRA SILIWANGI PADJAJARAN	Rp 99.544.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.096.382/2026 25 Jun 2026	...
Pembangunan MCK Individu - Paket 37 Desa Susukan Kec. Campaka	Rp 25.000.000	DAU	CV. MANDALA PUTRA SALUYU	Rp 24.774.100	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.094.374/2026 24 Jun 2026	...
Pembangunan MCK Individu - Paket 13 Desa Kawungluwuk Kec. Sukaresmi	Rp 125.000.000	DAU	CV. MANDALA PUTRA SALUYU	Rp 99.458.600	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.095.378/2026 24 Jun 2026	...
Kp. Pasir Nangka Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.615.200	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.092.366/2026 18 Jun 2026	...
Kp. Cipetir Desa Sukatani Kec. Haurwangi	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.534.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.091.362/2026 18 Jun 2026	...
Kp. Cibiuk RT Emam Desa Cibiuk Kec. Ciranjang	Rp 75.000.000	DAU	CV. AIDA SENTOSA JAYA	Rp 74.060.500	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.093.370/2026 18 Jun 2026	...
Komitmen 12 Paket • Pembangunan MCK Individu - Paket 21 Desa Sirnagalih Kec. Sindangbarang • Pembangunan MCK Individu - Paket 9 Desa Cinerang Kec. Naringgul	Rp 300.000.000	DAU	CV. Yusuf Rahmat Hidayat	Rp 299.343.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.083.330/2026 3 Jun 2026	...
	Rp 75.000.000	DAU	CV. RAYYAN RAIHAN	Rp 49.652.800	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.084.334/2026 5 Jun 2026	...
Komitmen 13 Paket • Pembangunan MCK di Kp. Simasari Rt.006/002 Desa Sukajaya kec. Leles • Pembangunan MCK Kp. Cikalapa Rt. 09/04 Desa Cinerang Kec. Naringgul • Pembangunan MCK Kp. Cisarap Rt. 016/04 Desa Sukajaya Kec. Leles	Rp 300.000.000	DAU	CV. ARKHAN BANGUN MANDIRI	Rp 298.699.000	602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.087.346/2026 5 Jun 2026	...

Gambar 5. Pengelolaan Kontrak — /kontrak

Aset SPAM & Capaian SPM

Pantau capaian SPM, integrasi pekerjaan air minum per desa, dan kelola master unit SPAM.

Capaian SPMIntegrasi WilayahMaster Unit SPAM

Filter Capaian SPM

Data capaian unit SPAM, target desa, BJP, dan anggaran — terpisah dari integrasi pekerjaan.

Semua KecamatanSemua DesaSemua Tahun

Periode capaian: uld tahun 2025Acuan master uld 2025Integrasi 2026+ terpisah

Target KK Desa534.952

SR Tercatat53.205

KK / jiwa53.206 KK266.020 jiwa

Anggaran TercatatRp 91.474.124.404

Capaian SPM13.24%

Unit SPAM36433 UnitSPAM - 331 standar

Komposisi Capaian

Acuan master tidak diampa. Capaian integrasi hanya tahun 2026 ke atas.


Indikator	Acuan s/d 2025	Integrasi 2026+	Total Tercatat
Sumbangan Rumah (SR)	53.131	74	53.205
Kepala Keluarga (KK)	53.131	75	53.206
Jiwa Terlayani	265.657	363	266.020
Nilai Kontrak / Anggaran	Rp 90.479.525.404	Rp 994.599.000	Rp 91.474.124.404

Perhitungan Cakupan SPM


(JP * Total BJP) / Target KK desa * 100%

Jumlah Penduduk (JP) — KK tercatat	53.131 KK
BJP Master (desa)	17.521 KK
BJP Unit SPAM	160 KK
Total BJP	17.681 KK
BJP jiwa (estimasi x5)	88.405 jiwa
Cakupan SPM	13.24%


Gambar 6. Aset & Capaian SPAM — /spam-unit

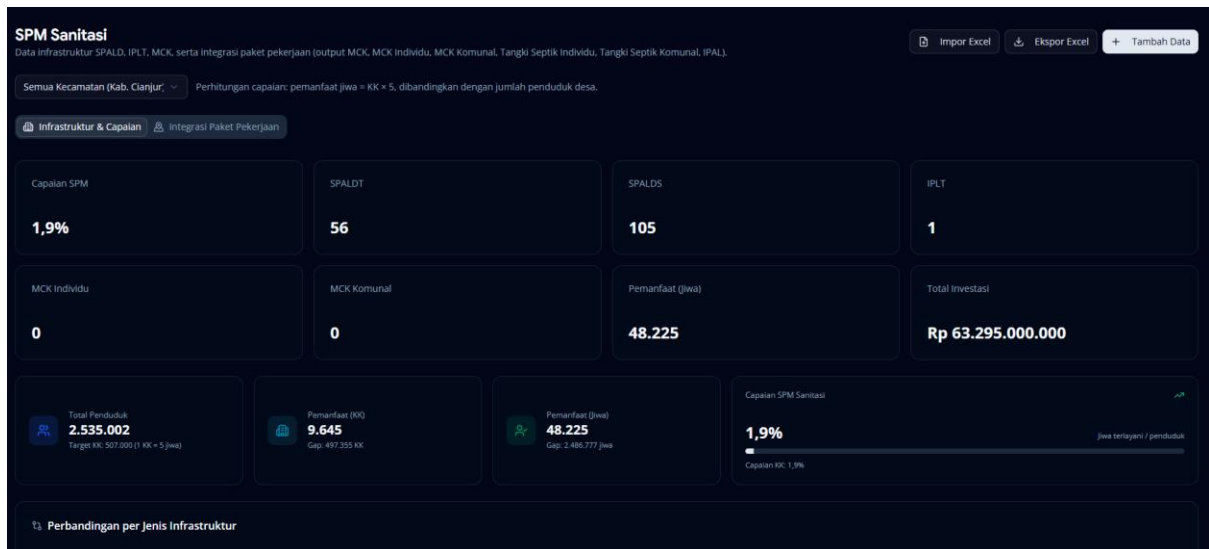


Gambar 7. SPM Sanitasi — /spm-sanitasi

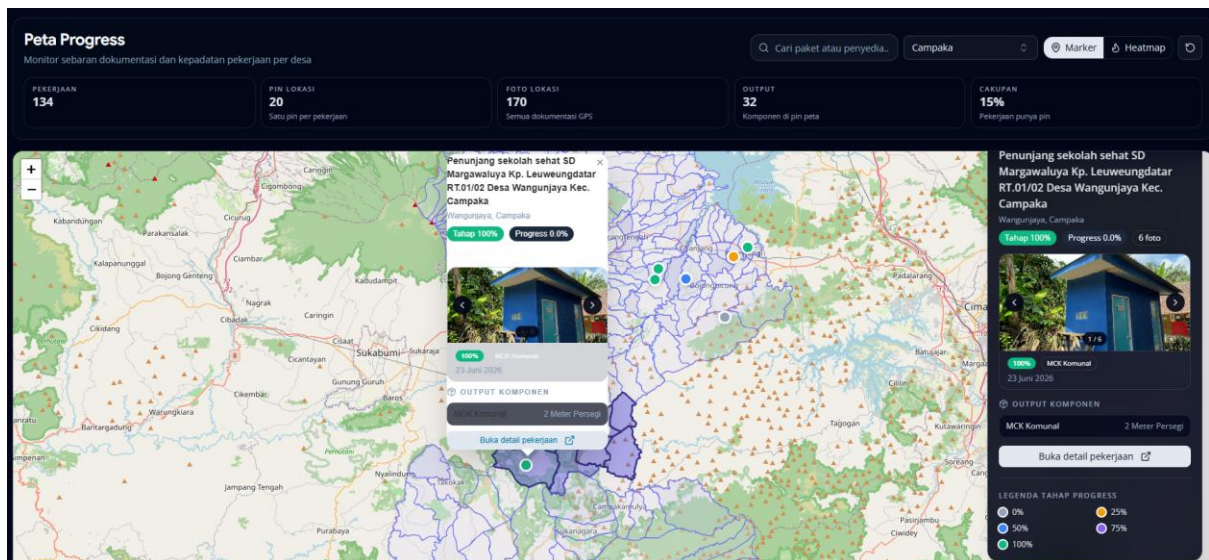


Gambar 8. Peta Progress — /map

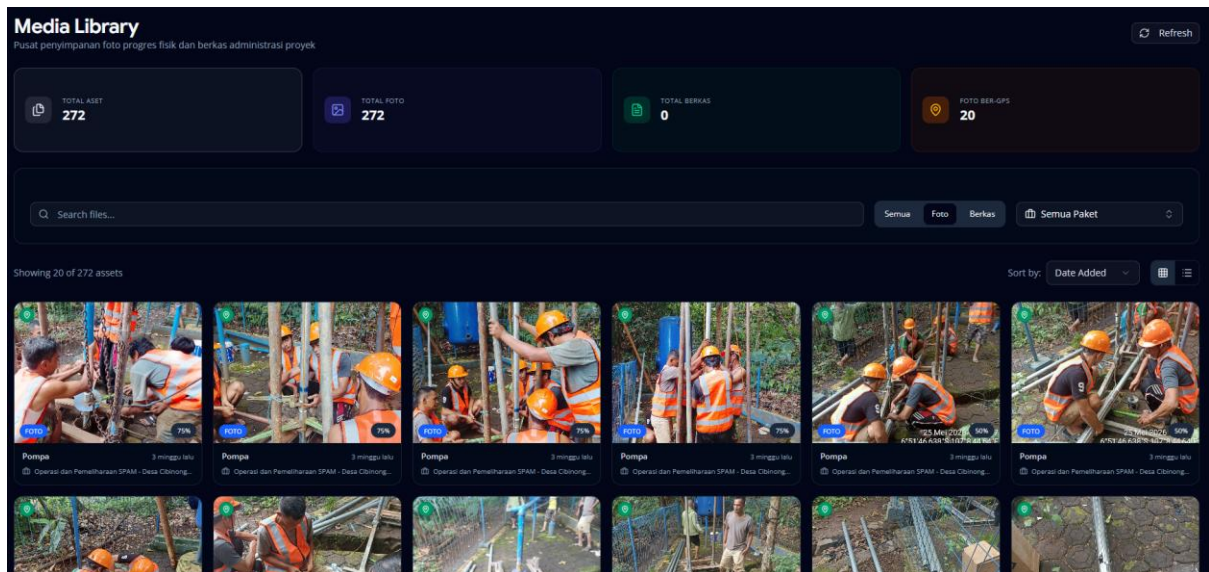


Gambar 9. Galeri Foto — /foto

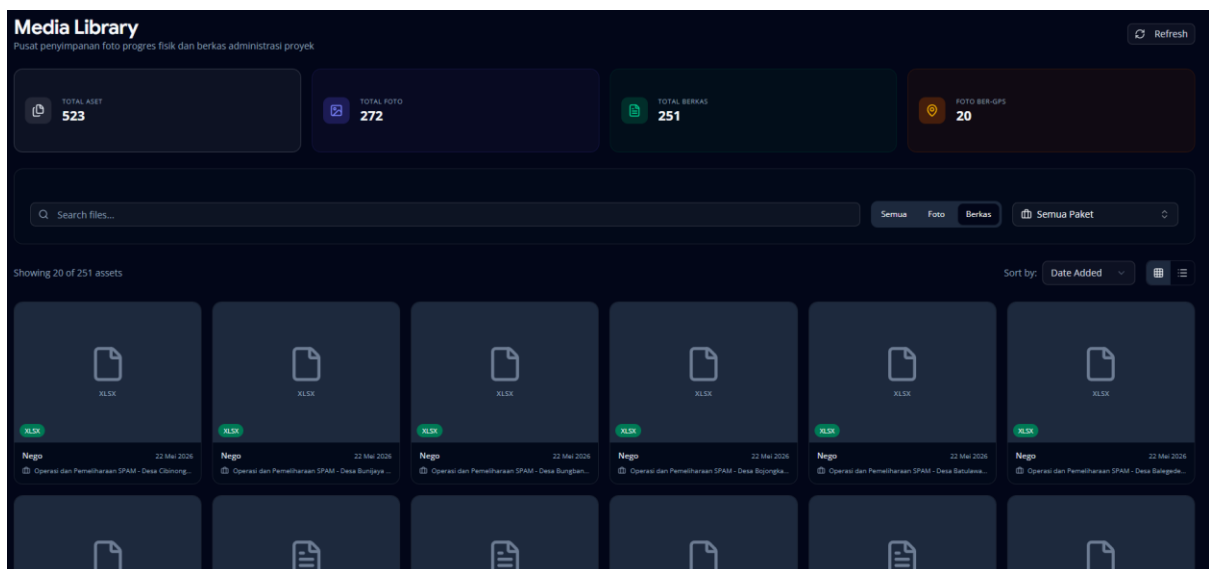

Gambar 10. Manajemen Berkas — /berkas

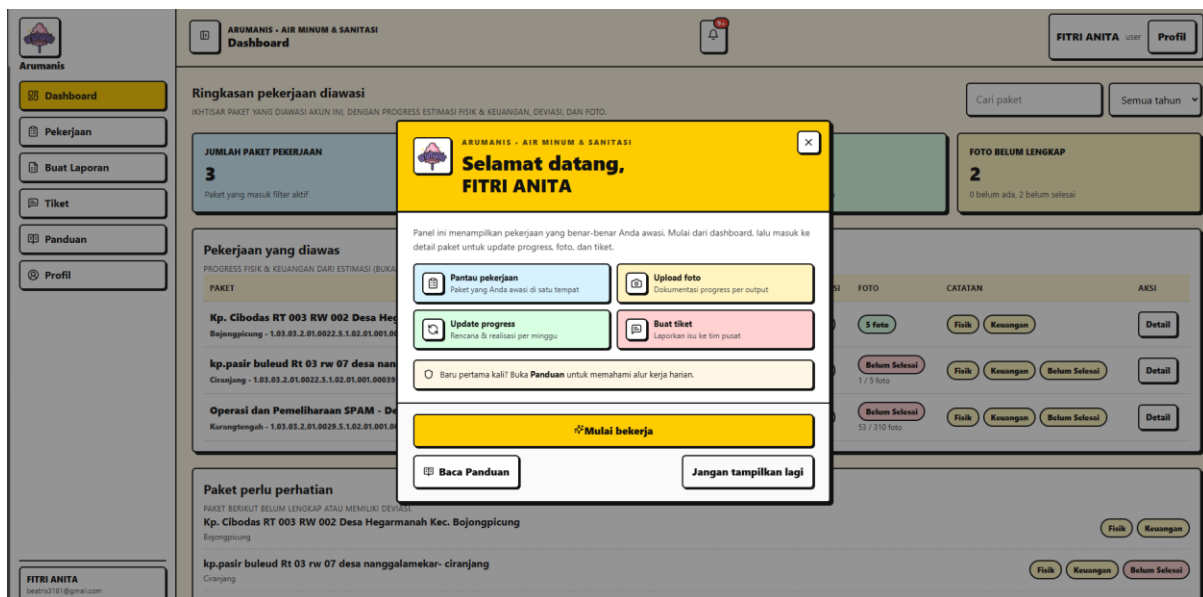

Gambar 11. Panel Pengawasan — Dashboard (impersonate FITRI ANITA, role user pengawas)

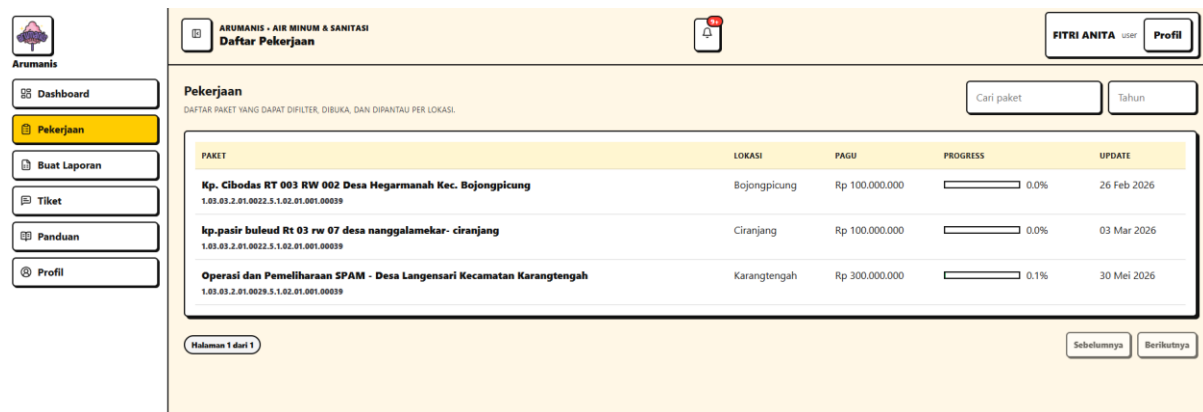

Gambar 12. Panel Pengawasan — Daftar Pekerjaan (/pengawasan/pekerjaan)

Kembali

Buat Laporan Mingguan

Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Langensari Kecamatan Karangtengah

Karangtengah

Langensari

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Progress RAB

0.1%

Pengawas: Fitri Anita

1.03.03.2.01.0029.5.1.02.01.001.00039

TOTAL BOBOT

100.0%

Akumulasi bobot item

DEVIASI

0.0%

Selisih realisasi dengan rencana

PROGRESS TERHITUNG

0.1%

Dari komposisi progress

MINGGU

18

Batas waktu tersedia

Tambah item pekerjaan

TAMBAHKAN ITEM BARU KE DAFTAR LAPORAN

NAMA ITEM

RINCIAN ITEM

SATUAN

TARGET VOLUME

BOBOT (%)

HARGA SATUAN

Contoh: Pekerjaan persiapan

Detail pekerjaan (opsional)

Pilih satuan

0

0

0

+ Tambah item

Reset form

Rincian per minggu

ISi KOLOM RENCANA DAN REALISASI LALU SIMPAN

MINGGU AKTIF

Minggu 1

Simpan

ITEM	SATUAN	TARGET	RENCANA	REALISASI	STATUS
PEKERJAAN PERSIAPAN Pembersihan lokasi	Ls	1	1	1	1.0%
PEKERJAAN PERSIAPAN Direksi keet (sewa)	unit	1	0	0	Belum diisi

Gambar 15. Panel Pengawasan — Buat Laporan mingguan

Kembali

Operasi dan Pemeliharaan SPAM - Desa Langensari Kecamatan Karangtengah

Belum selesai

manual

Karangtengah

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

TA 2026

Pagu Rp 300.000.000

Progress

0.0%

Pengawas: Fitri Anita

Pendamping:

Dibuat 02 Jan 2026

Ringkasan

Output

Penerima

Foto

Progress

Tiket

Jumlah: 0

Terbuka: 0

Tertutup: 0

Buka halaman tiket

Tambah tiket

MULAI DENGAN MENAMBAHKAN TIKET PERTAMA

SUBJEK

KATEGORI

PRIORITAS

Masukkan subjek tiket

Umum

Rendah

DESKRIPSI

Jelaskan isu, lokasi kejadian, atau tindakan yang dibutuhkan

Buat tiket

Batal

Tiket pekerjaan

DAFTAR TIKET YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN INI

Gambar 16. Panel Pengawasan — Tiket kendala lapangan

Petunjuk Teknis Aplikasi Arumanis — Halaman 17

Tiket & Laporan

Kelola laporan bug dan permintaan dari pengawas lapangan

Review Tiket

Berikan catatan admin dan ubah status tiket dari pengawas.

Oleh: Kategori

Update Status

Open (Menunggu)

Catatan Admin (Akan dilihat oleh pengawas)

Berikan jawaban atau catatan untuk pengawas...

Batal

Update Status & Catatan

Semua Tiket

Daftar seluruh tiket yang masuk dari sistem.

Sembunyikan Closed

Menampilkan 74 dari 74 tiket

Status	Subjek & Deskripsi	Aksi
Closed	lokasi desa tidak muncul PEMBUATAN SEPTIC TANK (ADE RAHMAT) KP. CIBITUNG RT.004/008 DESA MARGALUYU KECAMATAN CAMPAKA KAI Oleh: Ali Imron	
Closed	lokasi desa tidak muncul PEMBUATAN SEPTIC TANK (ADE RAHMAT) KP. CIBITUNG RT.004/008 DESA MARGALUYU KECAMATAN CAMPAKA KAI Oleh: Ali Imron	
Closed	lokasi desa tidak muncul PEMBUATAN SEPTIC TANK (ADE RAHMAT) KP. CIBITUNG RT.003/008 DESA MARGALUYU KECAMATAN CAMPAKA KAE Oleh: Ali Imron	
Closed	Lokasi Desa/Kecamatan Tidak Muncul PEMBUATAN WC(KHOER) KP. BOJONG SALAM RT.001/008 DESA MARGALUYU KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN Oleh: Ali Imron	

Gambar 17. Tiket & Laporan Arumanis Utama — /tiket

Daftar User

Kelola akun pengguna sistem

Tambah User

Data User

Cari nama atau email...

Nama	Email	NIP	Jabatan	Roles	Aksi
Ilham	ilhamtaufiq@gmail.com	-	-	admin	
absp dpkp	abs.dpkpp@gmail.com	-	-	pengawas	
bid abs	485qjr@gmail.com	-	-	user	
hedi herdiannyah	hedihherdiannyah72@gmail.com	-	-	user	
YOGI GINANJAR	ginanjaryogi30@gmail.com	-	-	user pengawas	
Ilham Taufiq (Itx)	ilhamtaufiq97@gmail.com	1234567899	-	pengawas	
Erik Ardiannyah	ardiy777@gmail.com	-	-	user pengawas	
Zal Faqot	zalfaqot15@gmail.com	-	-	user pengawas	
Aditya Prasetya Pamungkas	adityaprasetya274@gmail.com	-	-	operator pengawas	
Sania Ainun Qolbi	saniaainun35@gmail.com	-	-	pengawas	
DEDEN IRAWAN	dedenirawan93@gmail.com	-	-	konsultan_pengawas	
Deden Permana	aw.dedenpermana@gmail.com	-	-	konsultan_pengawas	
Aditya Heryansyah	adityawins93@gmail.com	-	-	user pengawas	

Gambar 18. Manajemen User & tombol Impersonate — /users (admin)

Petunjuk Teknis Aplikasi Arumanis — Halaman 18

LAMPIRAN B GLOSARIUM SINGKAT

1. ARUMANIS — Air Minum & Sanitasi Cianjur
2. SPAM — Sarana Penyediaan Air Minum
3. SPM — Standar Pelayanan Minimum
4. SPALD-T/S — Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
5. POKMAS — Kelompok masyarakat pengelola unit SPAM
6. Pagu — Anggaran program (Rupiah)
7. Fiscal Year — Tahun anggaran yang dipilih di header
8. SSO — Single Sign-On ke Panel Pengawasan
9. RBAC — Role-Based Access Control
